

POR - 2007-2013

Axa Prioritară 1, Domeniul major de intervenție 1.1.

**Planul Integrat de Dezvoltare Urbană
al Polului de Creștere
Ploiești-Prahova**

Partea a 4-a: Planul de acțiune

- Document transmis spre consultare -

30 septembrie 2009

Partea a 4-a: Planul de Acțiune

Cuprins	pagina
4.1. Argumente strategice și operaționale	3
4.2. Pachetul de proiecte	8
4.2.1. Prezentare proiecte organizate pe secțiuni conform structurii părții 2	8
Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale	
Secțiunea II: Infrastructura de mediu	
Secțiunea III: Infrastructura economică	
Secțiunea IV: Dezvoltarea resurselor umane și a capacității administrative	
Secțiunea V: Politici Complementare (PNDR)	
4.2.2. Lista proiectelor coordonate cu obiectivele de dezvoltare și cu surse de finanțare	30
4.2.3. Lista proiectelor selectate spre co-finanțare prin POR - axa prioritară 1	37
4.3. Graficul de implementare a proiectelor	37
4.4. Fișa proiectelor propuse spre co-finanțare	42

PIDU Pol de Creștere Ploiești-Prahova

Planul de Acțiune

Partea a IV-a PIDU Pol de Creștere Ploiești-Prahova conține proiecte multisectoriale a căror implementare va fi organizată pe perioada 2009-2025. Proiectele cuprinse în cadrul PIDU al Polului de Creștere Ploiești-Prahova sunt formulate în baza politicilor și programelor identificate în cadrul părții a II-a, și răspund problematicii precizate în cadrul părții I a PIDU (probleme și analiza SWOT).

Proiectele, în număr de 91, au fost transmise de fiecare din unitățile administrativ teritoriale din cadrul Polului de Creștere și se încadrează în obiectivele strategice și specifice de dezvoltare a acestuia. Dintre acestea au fost selecționate pentru perioada 2009-2015 un număr de 16 proiecte care răspund următoarelor cerințe:

1. Proiectul răspunde unei probleme clar identificate și a cărei rezolvare conduce la îmbunătățirea situației existente și la obținerea unui avantaj competitiv pentru Polul de creștere și a zonei sale de influență;
2. Rezultatele proiectelor conduc la atingerea obiectivelor generale și a obiectivelor sectoriale ale PIDU Ploiești-Prahova;
3. Proiectul se află într-o fază avansată din punct de vedere al studiilor tehnico-economice și al aspectelor juridice privind terenul (proprietate, exproprieri);
4. Proiectul a fost acceptat de partenerii Polului de Creștere Ploiești-Prahova;
5. Prin analiza cost beneficiu, proiectul are indicatori de performanță financiari și economici;
6. Lucrările proiectului sunt gata până la data de 31.07.2015.

4.1. Argumente strategice și operaționale

4.1.1. Coordonare cu documentele programatice, strategii locale, planuri urbanistice și de amenajare a teritoriului, studii sectoriale

Pentru a asigura condițiile de co-finanțare, tematica proiectelor se regăsește în (1). Domeniile de intervenție specificate în textul axelor prioritare ale POR, POS-uri, PNDR, dar și în (2). Cadrul recomandat privind activități eligibile, detaliat în documentele menționate anterior.

Din punct de vedere legal, al existenței documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, proiectele prezentate în anexa A, din ghidul solicitantului sunt susținute de următoarele documentații:

1. Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Prahova (2006)
2. Plan de Amenajare a Teritoriului Intercomunal PATICO- Zona metropolitană Ploiești (2004)
3. PUG municipiul Ploiești (2000)

4. PUZ strada Mărășești, municipiul Ploiești (2004)
5. PUZ cartier Mitică Apostol, municipiul Ploiești (2004)

(De completat cu lista PUZ_urilor deja realizate/în curs de realizare și care susțin proiectele din punct de vedere urbanistic/amenajarea teritoriului)

Proiectele listate în Planul de Acțiune au suport în decizia locală, fiind coordonate cu două documente strategice fundamentale pentru dezvoltarea Polului de Creștere Ploiești-Prahova: "Strategia de Dezvoltare a Municipiului Ploiești 2007-2025" și "Planul de Dezvoltare Durabilă a Județului Prahova 2007-2013". Conformitatea cu aceste documente poate fi verificată prin accesarea paginilor web ale Primăriei municipiului Ploiești și Consiliului Județean Prahova:

http://www.ploiesti.ro/ploiesti_document.pdf.

http://www.cjph.ro/upload/files/Plan_dezvoltare_Hot_151.pdf

Proiectele privind investiții de capital în infrastructura de utilități publice au suport în studiile "Masterplanul apă canalizare" realizat pentru municipiul Ploiești și pentru Județul Prahova.

Proiectele privind investiții legate de realizarea de rampe ecologice, stații de transfer, stații de compostare și stații de sortare sunt cuprinse în cadrul Studiului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova".

Proiectele privind investiții în infrastructura rutieră și de transport sunt susținute prin "Studiul de circulație pentru municipiul Ploiești" și "Plan strategic de logistică la nivelul municipiului Ploiești".

4.1.2. Coordonare cu condițiile de finanțare

În cadrul Nivelului 1 sunt listate toate proiectele necesare atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă integrată menționate în Partea a II-a a PIDU și care sunt subiect de finanțare sau de co-finanțare prin toate sursele financiare locale, naționale sau europene pe orizontul de timp al anului 2025. Din punct de vedere al organizării pe surse de finanțare, proiectele propuse sunt listate pe secțiuni, conform listei programelor cuprinse în Partea a II-a PIDU, după cum urmează:

- **Proiectele din Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale** pot fi co-finanțate prin POR și prin Fondul de Mediu, respectând condițiile de eligibilitate pentru activități și cheltuieli;
- **Proiectele din Secțiunea II: Infrastructura de mediu** pot fi cofinanțate prin POS Mediu și POS Creșterea Competitivității Economice, respectând condițiile de eligibilitate pentru activități și cheltuieli;
- **Proiectele din Secțiunea III: Infrastructura economică** pot fi cofinanțate prin POS Creșterea Competitivității Economice și POR respectând condițiile de eligibilitate pentru activități și cheltuieli;
- **Proiectele din Secțiunea IV: Dezvoltarea resurselor umane și a capacității administrative** pot fi cofinanțate prin POS Dezvoltare Resurselor Umane, POS Competitivitate și POS Dezvoltarea Capacității


Administrative respectând condițiile de eligibilitate pentru activități și cheltuieli;

- **Proiectele din Secțiunea V: Politici Complementare** pot fi cofinanțate prin PNDR respectând condițiile de eligibilitate pentru activități și cheltuieli.

Acele proiecte existente în listă care se referă la activități neeligibile conform Programelor Operaționale, vor fi realizate prin alte surse locale sau naționale.

Cei trei piloni ai dezvoltării durabile a teritoriului Polului de creștere Ploiești-Prahova au ca fundament infrastructura fizică, socială, economică și de mediu finanțată prin POR , PO Sectoriale și PNDR.

Figura 1: Dezvoltarea durabilă a Polului de Creștere Ploiești-Prahova

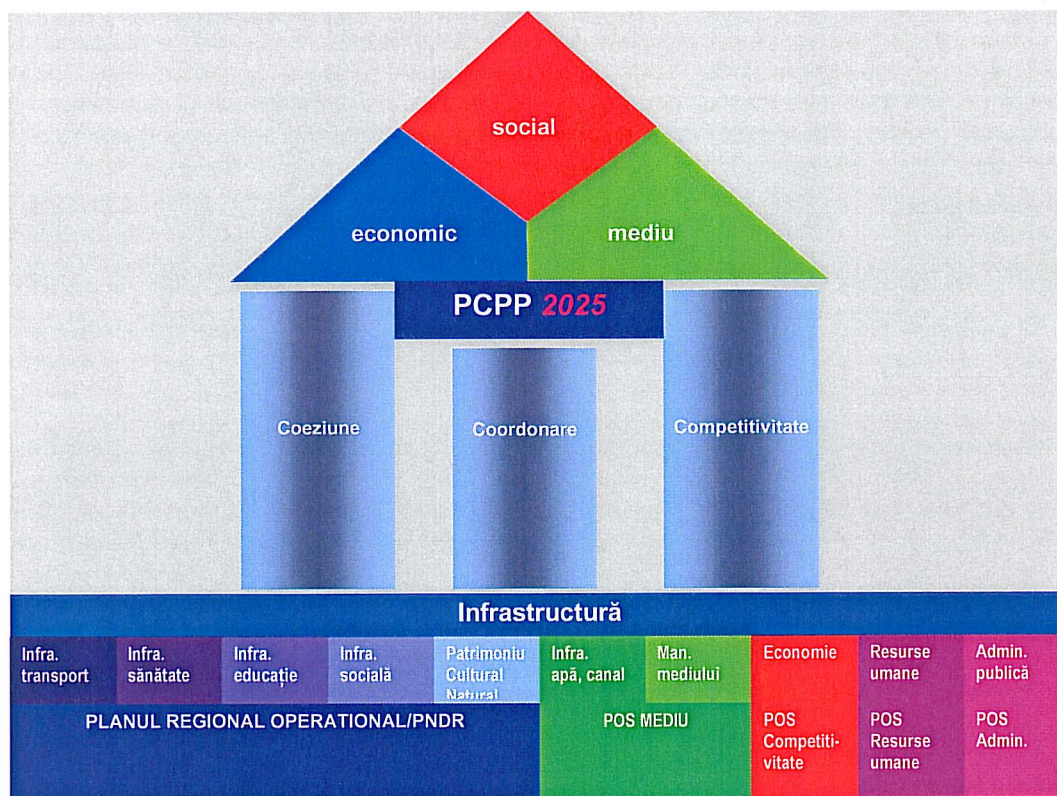

4.1.3. Coordonare cu condițiile operaționale

Din punct de vedere operațional, proiectele propuse, eligibile pentru axa prioritară 1 – Reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, sunt coordonate, sau sunt complementare cu investiții în curs de realizare și ținesc ca până în anul 2015 să completeze pachetul de investiții de capital ce va asigura accesibilitatea Polului de Creștere către infrastructura națională de transport rutier, prin reabilitări sau construcții de căi rutiere și pasaje către șoseaua de centură DN1, DN1A, DN1B și către coridorul european IX aflat în faza de execuție.

4.1.4. Coordonare cu aspectele sectoriale de intervenție a proiectelor

Din punct de vedere sectorial (teritoriu, mediu, economie, social) aceste proiecte sunt fundamentate în contextul problematicii specifice Polului de Creștere și programelor prioritare, contribuind la obținerea următoarelor rezultate:

Proiecte în infrastructura rutieră și transport: Infrastructura rutieră în condițiile realizării coridorului IV devine primordială. Mobilitatea în teritoriu, către obiectivele administrative, sociale și economice reprezintă prioritatea numărul 1 menționată în documentele strategice ce privesc dezvoltarea viitoare a Polului de Creștere.

Existența de terenurile libere în partea de vest a municipiului Ploiești și în zonele rurale, zone acoperite în mare parte cu studii urbanistice aprobate, exercită o presiune de dezvoltare din partea sectorului public și privat deopotrivă. Lipsa unei infrastructuri rutiere și de transport public adecvate va conduce la o congestie de trafic cu costuri de mediu, dar și cu o reducere a gradului de investiții, reducere măsurată prin locuri de muncă mai puține și prin venituri mai scăzute la bugetele locale, venituri constituite în principal din taxe de autorizare și prin impozit pe proprietate și pe cifra de afaceri.

Rezultatul acestor proiecte poate fi măsurat prin numărul de noi activități economice atrase pe teritoriul Polului de Creștere, reducerea timpului de comutare și reducerea factorilor de poluare din trafic, reducerea riscului de accidente și, nu cel din urmă, accesul locuitorilor din unitățile administrativ teritoriale partenere în Pol către autorități publice locale sau naționale și către unitățile de servicii publice amplasate în municipiul Ploiești (ex. spitalul județean).

Proiecte în dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri: Proiectele propuse întăresc profilul tehnologic al Polului, asigurând dezvoltarea parteneriatului între sectorul academic și sectorul privat în cercetare și în implementarea de noi investiții în domeniul surselor de energii alternative, dar și de metode de reabilitare a terenurilor poluate ca urmare a activităților de extracție și de prelucrare a petrolului. Rezultatele proiectelor conduc către amplificarea inițiativelor locale existente în implementarea politicilor de mediu (energia verde), la înlăturarea factorilor de risc privind poluarea apei subterane, precum și la refuncționalizarea terenurilor poluate cu activități sociale sau economice.

Proiecte în reabilitarea infrastructurii sociale: Numărul de proiecte propuse sunt direcționate către creșterea coeziunii sociale, oferind grupurilor cu dizabilități fizice posibilitatea de fi în contact cu administrația publică și cu instituțiile publice ce oferă servicii și utilități, dar și acces la condiții decente de locuire, supraveghere și servicii de sănătate pentru unele grupuri sociale. Rezultatele acestor proiecte conduc către satisfacția cetățenilor, creșterea respectului față de grupurile sociale dezavantajate fizic sau economic, grupuri care fac parte integrantă din comunitatea Polului de Creștere Ploiești-Prahova. Din punct de vedere economic, aceste servicii generează locuri de muncă calificate în managementul clădirilor, managementul serviciilor și serviciile specifice fiecărui tip de investiție.

Coordonarea veniturilor și cheltuielilor necesare exploatareii ulterioare a acestor investiții, după anul 2015, a reprezentat un criteriu de selectare a

IHS Romania SRL/30.09. 2009

proiectelor. Elementele urmărite pentru generarea de resurse necesare întreținerii viitoare a acestor investiții sunt descrise după cum urmează:

1. Co-finanțarea proiectelor prin Fondurile Structurale ale UE degrevează bugetele locale pe linia bugetară „investiții de capital” și permite o regândire a folosirii veniturilor locale către cheltuieli de mediu și sociale, altele decât cele eligibile prin POR și POS de mediu. Cu o cofinanțare de 2% partenerii Polului atrag o co-finanțare de 97 milioane de euro. Această sumă cheltuită cu proiecte aduce avantaje economice întregului teritoriu al Polului de Creștere, prin impactul indicatorilor de performanță ce privesc creșterea locurilor de muncă și atragerea de noi investiții, dar și prin reducerea unor costuri de exploatare sau a unor factori de mediu.
2. Activitățile necesare pentru întreținerea investițiilor de capital realizate până în anul 2015 din suma de 97 milioane de euro în domeniul “Infrastructură Rutieră și Infrastructură Socială” vor solicita din momentul finalizării lor cheltuieli făcute din bugetele locale. Din acest motiv, proiectele din domeniul “Dezvoltarea mediului de afaceri” sunt propuse ca sursă generatoare de venituri pentru comunitățile locale, în echilibru cu proiectele care solicită costuri viitoare de exploatare.
3. Alegerea proiectelor din domeniul infrastructurii rutiere în scopul creșterii accesibilității, susținute cu argumentele economice menționate la analiza sectorială prezentată anterior, este fundamentată prin generarea de beneficii economice, obținute în urma valorificării unor resurse importante de teren, în prezent liber (cazul Ploiești vest), prin realizarea de investiții în locuințe, în activități economice sau în investiții cu caracter social/recreere, conform PUZ Mitică Apostol, municipiul Ploiești.

4.2. Pachetul de proiecte

4.2.1. Prezentarea proiectelor organizate pe secțiuni conform structurii părții a 2-a PIDU¹

Secțiunea I²: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale

- **Program SI-1A-1:** Reabilitarea/modernizarea rețelei de drumuri locale inclusiv pasaje și poduri pentru asigurarea legăturilor radiale de transport din municipiul Ploiești către DN1, DN1A și DN1B (8 proiecte³)

Proiecte:

SI-1A-1a: Realizare pasaj rutier magistrala CF București-Brașov, strada Mărășești-Cartierul de Vest pentru creșterea gradului de accesibilitate a municipiului Ploiești dinspre coridorul european TEN-IV și dinspre cartierul Mitică Apostol

SI-1A-1b: Legătura rutieră dintre pasaj magistrală CF București-Brașov și DN1, inclusiv lucrările de racordare la acesta (în coordonare cu tema Proiectului SI-1A-1a)

SI-1A-1c: Realizare pasaj rutier peste CF Gara de Sud, municipiul Ploiești, pentru asigurarea conectării municipiului Ploiești cu zona cartier Mimi⁴ (în coordonare cu tema proiectului SI-1A-2d)

SI-1A-1d: Modernizarea și reabilitarea DJ 101D, km4-km6, și a pasajului peste CF în sat Tătărani, Comuna Barcănești pentru îmbunătățirea accesibilității dinspre DN1 (proiect în realizare)

SI-1A-1e: Realizare pasaj rutier peste CF, Bariera Unirii, Ploiești pentru creșterea accesibilității în partea de est a municipiului și către coridorul TEN-IX (în coordonare cu proiectul SI-1A-2e)

SI-1A-1f: Pasaj rutier peste CF Ploiești-Mâneciu între DN1 și Drumul Vinului

SI-1A-1g: Realizare pasaj rutier, peste DN1B în continuarea DJ 102 în comuna Blejoi, pentru creșterea accesibilității zonei de nord a polului de creștere și a locuitorilor acesteia către spitalul județean amplasat în municipiul Ploiești

SI-1A-1h: Pasaj rutier peste DN1 în zona comunei Blejoi și a comunei Păulești, zona comercială de nord a municipiului Ploiești (în coordonare cu proiect SI-1A-2i)


¹ Primul cod numeric reprezintă **Secțiunea**, al doilea cod numeric reprezintă **Programul** iar al treilea cod numeric reprezintă **Proiectul**

² Sursa de finanțare: POR și Fondul de mediu

³ Toate proiectele aduc o contribuție majoră la îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate între Polul de Creștere și coridoarele magistrale de trafic TEN-IV și TEN-IX, precum și locuitorilor din cartierele Mitică Apostol, Mimi⁴, Râfov, cuprinse în intravilanul municipiului Ploiești, și care nu au condiții egale de acces la autorități și instituții publice cu ceilalți locuitori ai municipiului.

⁴ Pasajul va fi realizat în conformitate cu prevederile PUG municipiul Ploiești

**Prezentarea spațială a proiectelor cuprinse în cadrul
Secțiunii I / Program SI-1A-1**

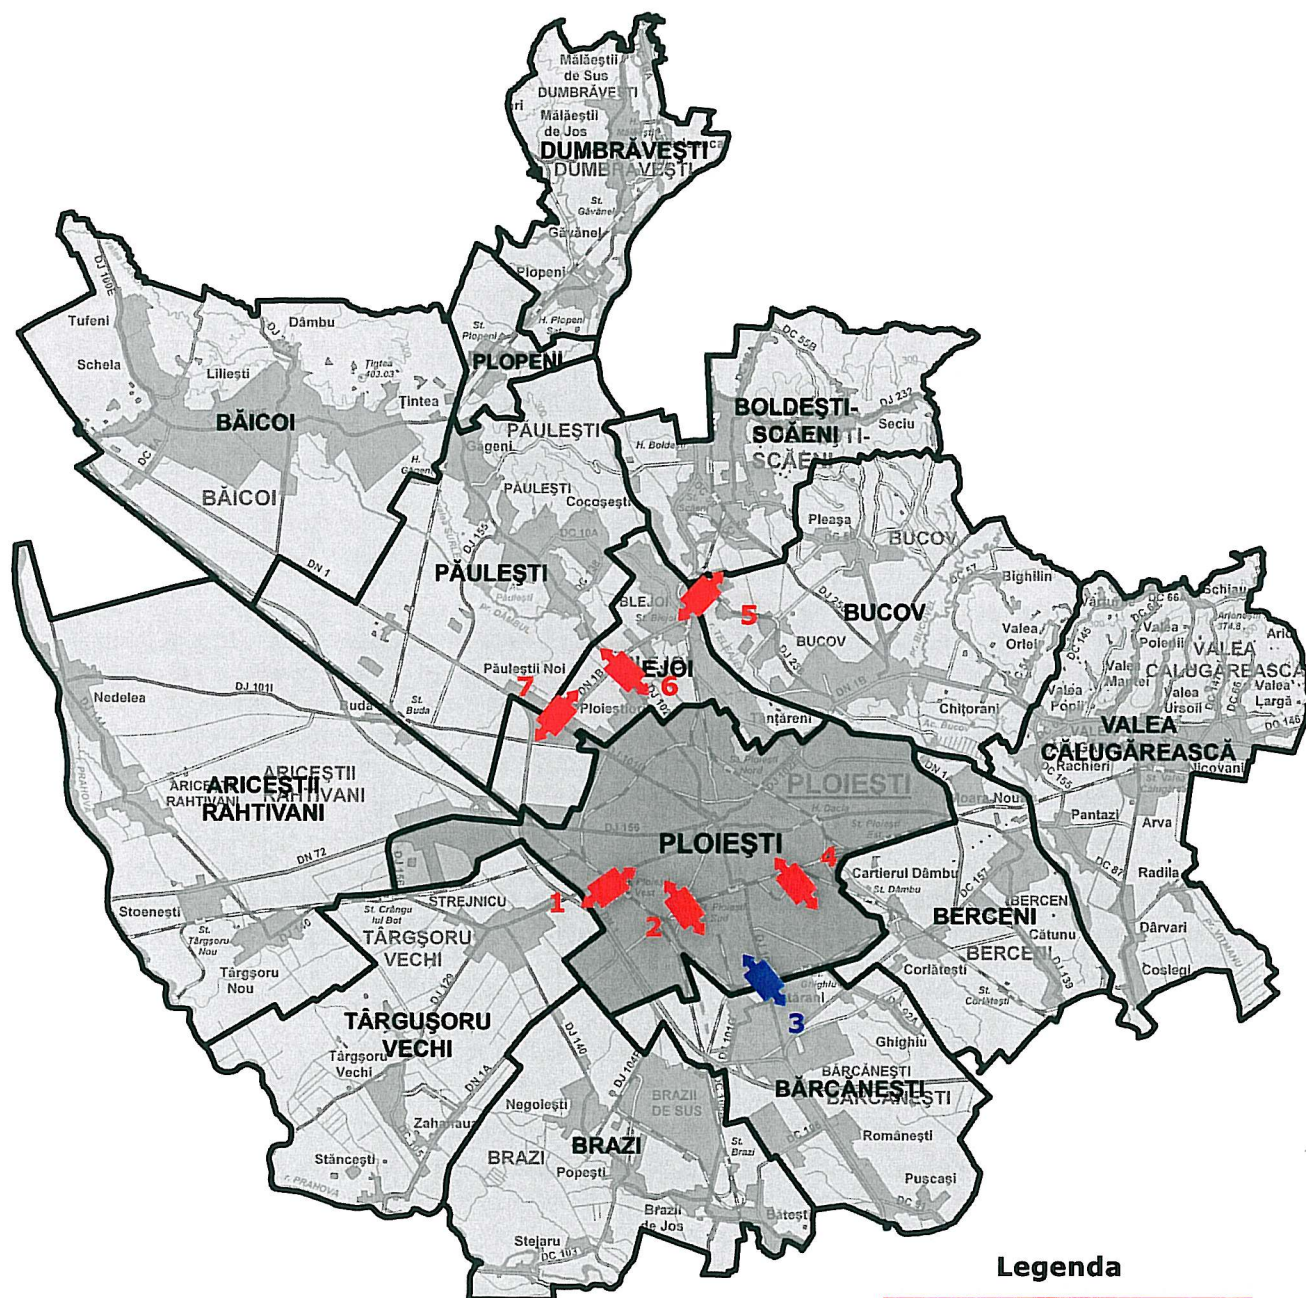

Legenda

1	SI - 1A - 1a și 1b
2	SI - 1A - 1c
3	SI - 1A - 1d (în lucru)
4	SI - 1A - 1e
5	SI - 1A - 1f
6	SI - 1A - 1g

Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale

- **Program SI-1A-2:** Creșterea mobilității în municipiul Ploiești și în cadrul Polului de Creștere, prin folosirea unui trafic integrat și de moduri de transport public nepoluante

Proiecte:

SI-1A-2a: Reabilitare traseu tramvai 102, municipiul Ploiești, prin lucrări vizând calea de rulare, stații adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizarea și automatizare

SI-1A-2b: idem pentru linia 101

SI-1A-2c: Reabilitare șoseaua Vestului din municipiul Ploiești tronson II-str. Cosminelor/sos. Nordului (în coordonare cu tema proiectului SI-1A-2a)

SI-1A-2d: Prelungire legătură rutieră și de transport public între Gara de Vest și Gara de Sud, str. Libertății, inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor (în coordonare cu tema proiectului SI-1A-1c)

SI-1A-2e: Legătura rutieră dintre Gara de Sud și cartierul Bereasca, pentru creșterea mobilității în partea de est a municipiului și descongestionarea traficului în zona centrală a acestuia (în coordonare cu tema proiectului SI-1A-1e)

SI-1A-2f: Extinderea transportului public din municipiul Ploiești, cuprinzând mijloace de transport și stații pe tronsonul DJ 102 municipiul Ploiești-comuna Blejoi-comuna Păulești și spre sud către comuna Bărcanești pe DJ 101D-DN1

SI-1A-2g: Terminal intermodal conectat la traseul tramvaiului 102 incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (zona Spital Județean)

SI-1A-2h: Terminal intermodal conectat la traseul tramvaiului 101 cuprinzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete, prin reabilitarea Autogării Ploiești Sud

SI-1A-2i: Realizarea legăturii rutiere între DN1 și DN1B, pentru descongestionarea traficului în zona de nord a municipiului Ploiești (în coordonare cu proiect SI-1A-1h)

**Prezentarea spațială a proiectelor cuprinse în cadrul
Secțiunii I / Program SI-1A-2**



Legenda

1	SI-1A-2a și 2 c
2	SI-1A-2b
3	SI-1A-2d
4	SI-1A-2e
5	SI-1A-2f
6	SI-1A-2g și 2h
7	SI-1A-2i

Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale

- **Program SI-1B-1:** Reabilitarea și modernizarea domeniului public urban

Proiecte:

SI-1B-1a: Reabilitarea domeniului public dintre blocurile cu locuințe din zonele urbane ale polului de creștere, inclusiv spațiile de joacă, drumuri, alei, spații de depozitare a deșeurilor menajere

SI-1B-1b: Reabilitarea și modernizarea drumurilor din zonele urbane ale Polului de Creștere, numai coordonat cu finalizarea lucrărilor de reabilitare rețele apă și canalizare realizate pe POS Mediu, axa prioritară 1

Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale

- **Program SI-1B-2:** Creșterea suprafeței zonelor verzi, parcuri și grădini


Proiecte:

SI-1B-2a: Realizarea parcului municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice

SI-1B-2b: Reabilitarea, dezvoltarea și valorificarea parcului „Constantin Stere”, inclusiv a căilor de acces și a utilităților publice

SI-1B-2c: Reabilitare spații verzi, alei și mobilier urban, inclusiv iluminat public în cadrul parcului “Cleopatra Trubețkoi” din Băicoi

**Prezentarea spațială a proiectelor cuprinse în cadrul
Secțiunii I / Program SI-1B-1 și SI-1B-2**

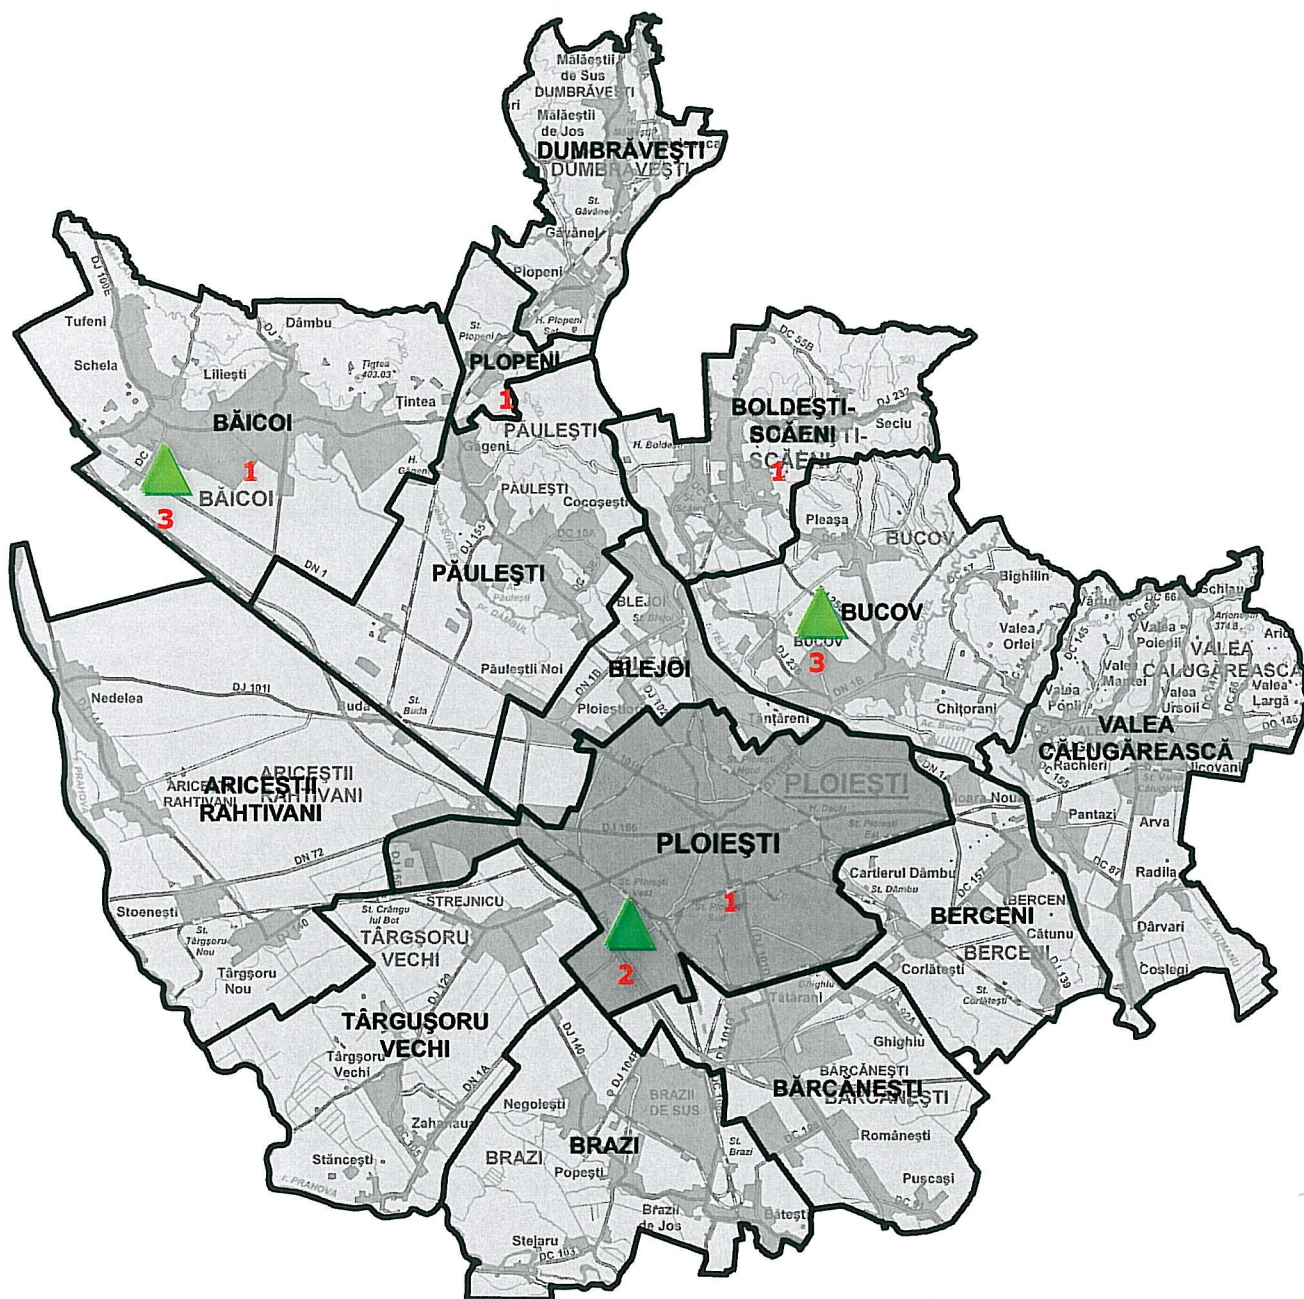

Legenda

1	SI-1B-1a și 1b
2	SI-1B-2a
3	SI-1B-2b și 2c

Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale

- **Program SI-2A-1:** Reabilitarea și modernizarea clădirilor, instalațiilor, echipamentelor și a facilităților pentru persoane cu dizabilități

Proiecte:

SI-2A-1a: Realizarea condițiilor de acces al persoanelor cu dizabilități în toate clădirile publice din Polul de Creștere Ploiești-Prahova

Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale

- **Program SI-2A-2:** Asigurarea unei infrastructuri de sănătate pentru locuitorii din polul de creștere

Proiecte:

SI-2A-2a: Modernizarea și reabilitarea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Ploiești, clădire și instalații

SI-2A-2b: Modernizarea și reabilitarea spitalelor/ambulatoriilor din zonele urbane ale Polului de Creștere Ploiești-Prahova

Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale

- **Program SI-3A-1:** Îmbunătățirea condițiilor de viață, construcții, echipamente, facilități, pentru grupurile sociale vulnerabile

Proiecte:

SI-3A-1a: Reabilitarea/dezvoltarea unei spălătorii sociale pentru persoane cu dizabilități, bătrâni fără familie și familii cu mulți copii în municipiul Ploiești

SI-3A-1b: Reabilitarea/extinderea centrelor de asistență din Ploiești (Complex de servicii Sf. Andrei), Plopeni (Centru Plasament), Băicoi (Complex servicii comunitare "Raza de Soare" și Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap-Liliești), Boldești-Scăeni (Unitatea de asistență medico-socială), Ariceștii Rahtivani (Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu handicap-Nedelea)

SI-3A-1c: Extinderea și modernizarea fermei de copii *Concordia* din comuna Ariceștii-Rahtivani

SI-3A-1d: Extinderea și modernizarea centrului de asistență pentru persoane adulte cu handicap în orașul Băicoi/Liliești

SI-3A-1e: Realizarea unui cămin de bătrâni prin schimbarea destinației cazarmei din str. Cosminelor nr. 11A, Ploiești

Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale

- **Program SI-3A-2:** Încurajarea și dezvoltarea cooperării cu sectorul privat, ONG-uri, cu activități în operarea serviciilor sociale

Proiecte:

SI-3A-2a: Realizarea unei rețele de servicii la domiciliu, pentru persoane în vârstă sau cu handicap

Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale

- **Program SI-3A-3:** Creșterea capacității operaționale a serviciilor de sănătate și sociale

Proiecte:

SI-3A-3a: Realizarea și implementarea de programe de perfecționare specializată pentru asistenții sociali și maternali

Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale

- **Program SI-4A-1:** Creșterea capacității de monitorizare, prevenire și de intervenție în situații de urgență generate de rafinării

Proiecte:

SI-4A-1a: Dezvoltarea/perfecționarea sistemului actual de urmărire a situațiilor de urgență

Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale

- **Program SI-5A-1:** Îmbunătățirea infrastructurii de educație universitară și cercetare

Proiecte:

SI-5A-1a: Realizarea și echiparea laboratoarelor necesare susținerii cercetării, în parteneriat cu sectorul privat, în domeniul energiilor alternative

Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale

- **Program SI-5A-2:** Reabilitarea, modernizarea și diversificarea infrastructurii educaționale preuniversitare

Proiecte:

SI-5A-2a: Reabilitare Colegiul "Virgil Madgearu"

SI-5A-2b: Modernizarea și echiparea spațiilor specializate în școli și licee

Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale


- **Program SI-5A-3:** Reabilitarea, modernizarea și echiparea grădinițelor

Proiecte:

SI-5A-3a: Punerea în siguranță din punct de vedere seismic, igienizarea, echiparea și mobilarea grădinițelor din Polul de Creștere Ploiești-Prahova (zonele urbane)

Prezentarea spațială a proiectelor cuprinse în cadrul Secțiunii I

Program SI-2A-1, SI-2A-2
Program SI-3A-1, SI-3A-2, SI-3A-3
Program SI-4A-1
Program SI-5A-1, SI-5A-2, SI-5A-3

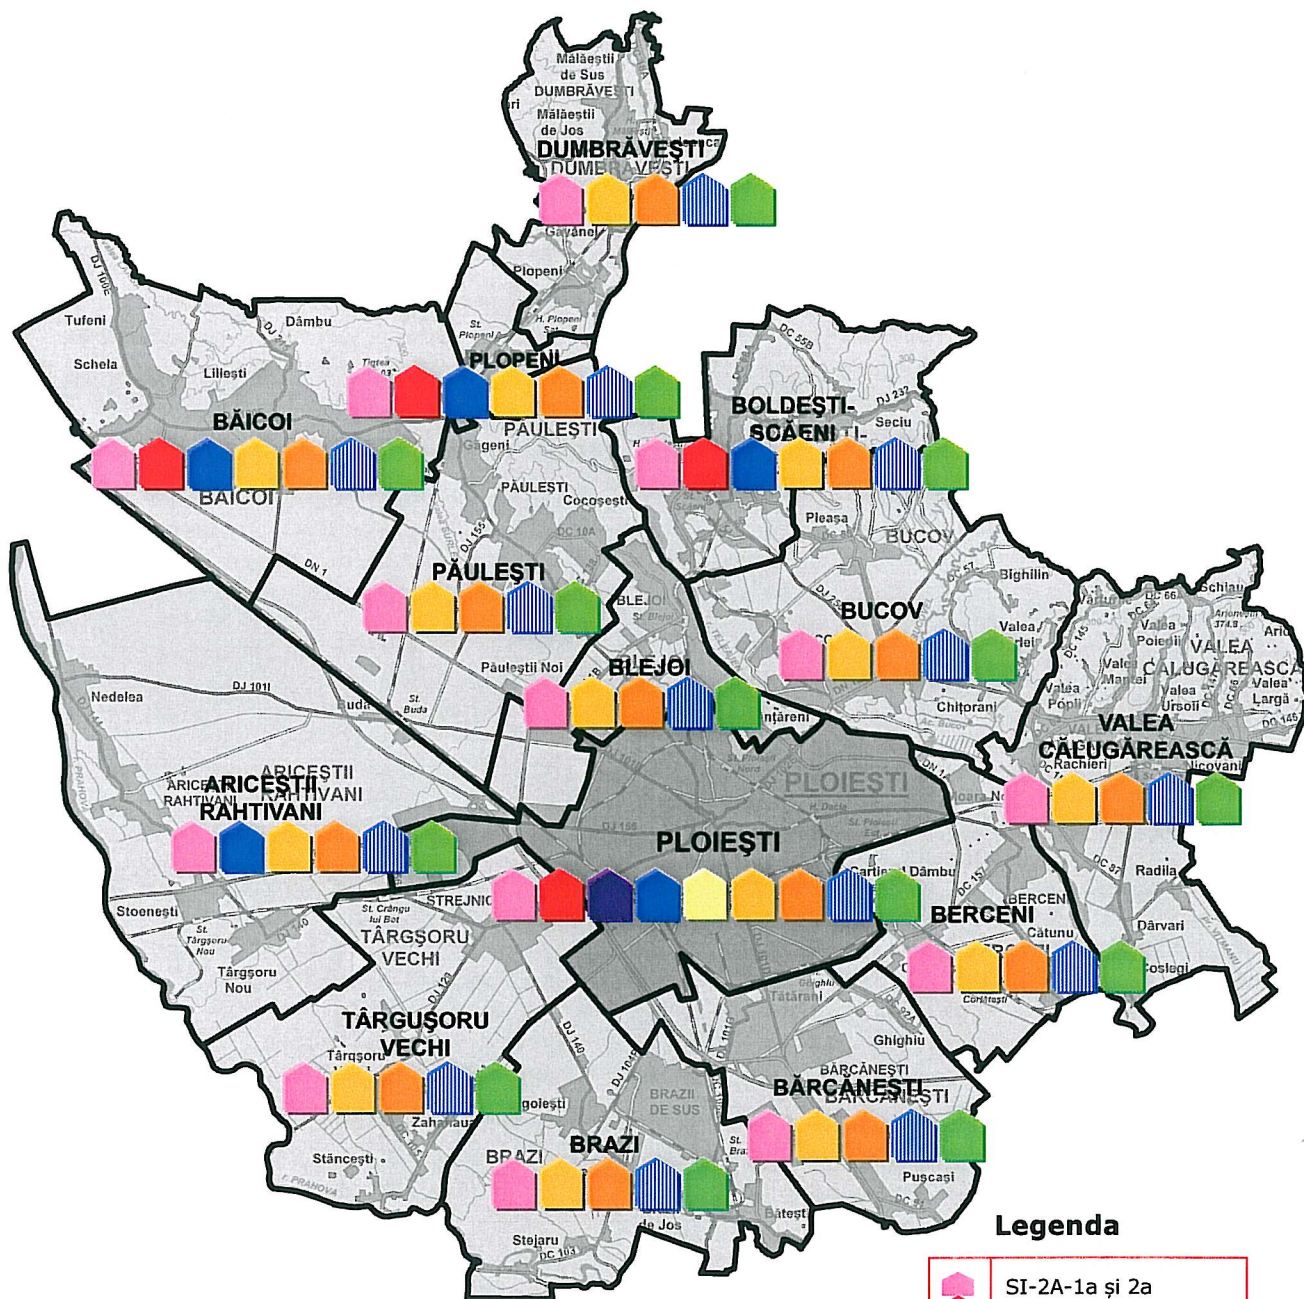

Legenda

	SI-2A-1a și 2a
	SI-2A-2a și 2b
	SI-3A-1a
	SI-3A-1b, 1c și 1d
	SI-5A-1a
	SI-5A-2a și 2b
	SI-5A-3a
	SI-3A-2a și 3b
	SI-4A-1a

Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale

- **Program SI-6A-1:** Reabilitarea și promovarea clădirilor cu valoare de patrimoniu

Proiecte:

SI-6A-1a: Modernizare imobil *Halele Centrale Ploiești*

SI-6A-1b: Crearea unei rețele culturale bazată pe tehnologia extragerii și prelucrării petrolului, constituită la nivel de Pol de Creștere prin realizarea muzeului Petrolului în municipiul Ploiești și prin reabilitarea căminelor culturale din zona rurală (coordonat cu PNDR măsura 3.2.2 renovarea și dezvoltarea satelor, punct B)

Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale

- **Program SI-6A-2:** Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural (trasee itinerante, situri arheologice)

Proiecte:

SI-6A-2a: Realizarea lucrărilor de conservare și de punere în valoare a siturilor arheologice existente în polul de creștere Ploiești Prahova (Dumbrăvești, Târgșoru Vechi, Ariceștii Rahtivani-Buda)

SI-6A-2b: Punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu existente pe traseele itinerante "drumul voievozilor", "drumul conacelor familiei cantacuzine", "circuitul Bucovelului" "drumul roman al vinului" (pentru zonele rurale se coordonează cu PNDR măsura 3.2.2 renovarea și dezvoltarea satelor, punct C) (Ploiești, Băicoi, Valea Călugărească, Blejoi, Brazi, Ariceștii Rahtivani, Târgșoru Vechi)

Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale

- **Programul SI-7A-1:** Conservarea patrimoniul natural

Proiecte:

SI-7A-1a: Protejarea și conservarea rezervației naturale forestiere "Broasca" (Bucov)

SI-7A-1b: Protejarea și conservarea rezervației forestiere "Pădurea Plopeni" (Plopeni, Păulești)

Secțiunea I: Construcție, reabilitare și renovare a infrastructurii locale

- **Programul SI-7A-2:** Diversificarea infrastructurii pentru activități hipice


Proiecte:

SI-7A-2a: Reabilitarea *Hipodromului* din municipiul Ploiești

Prezentarea spațială a proiectelor cuprinse în cadrul Secțiunii I

Program SI-6A-1, SI-6A-2

Program SI-7A-1, SI-7A2

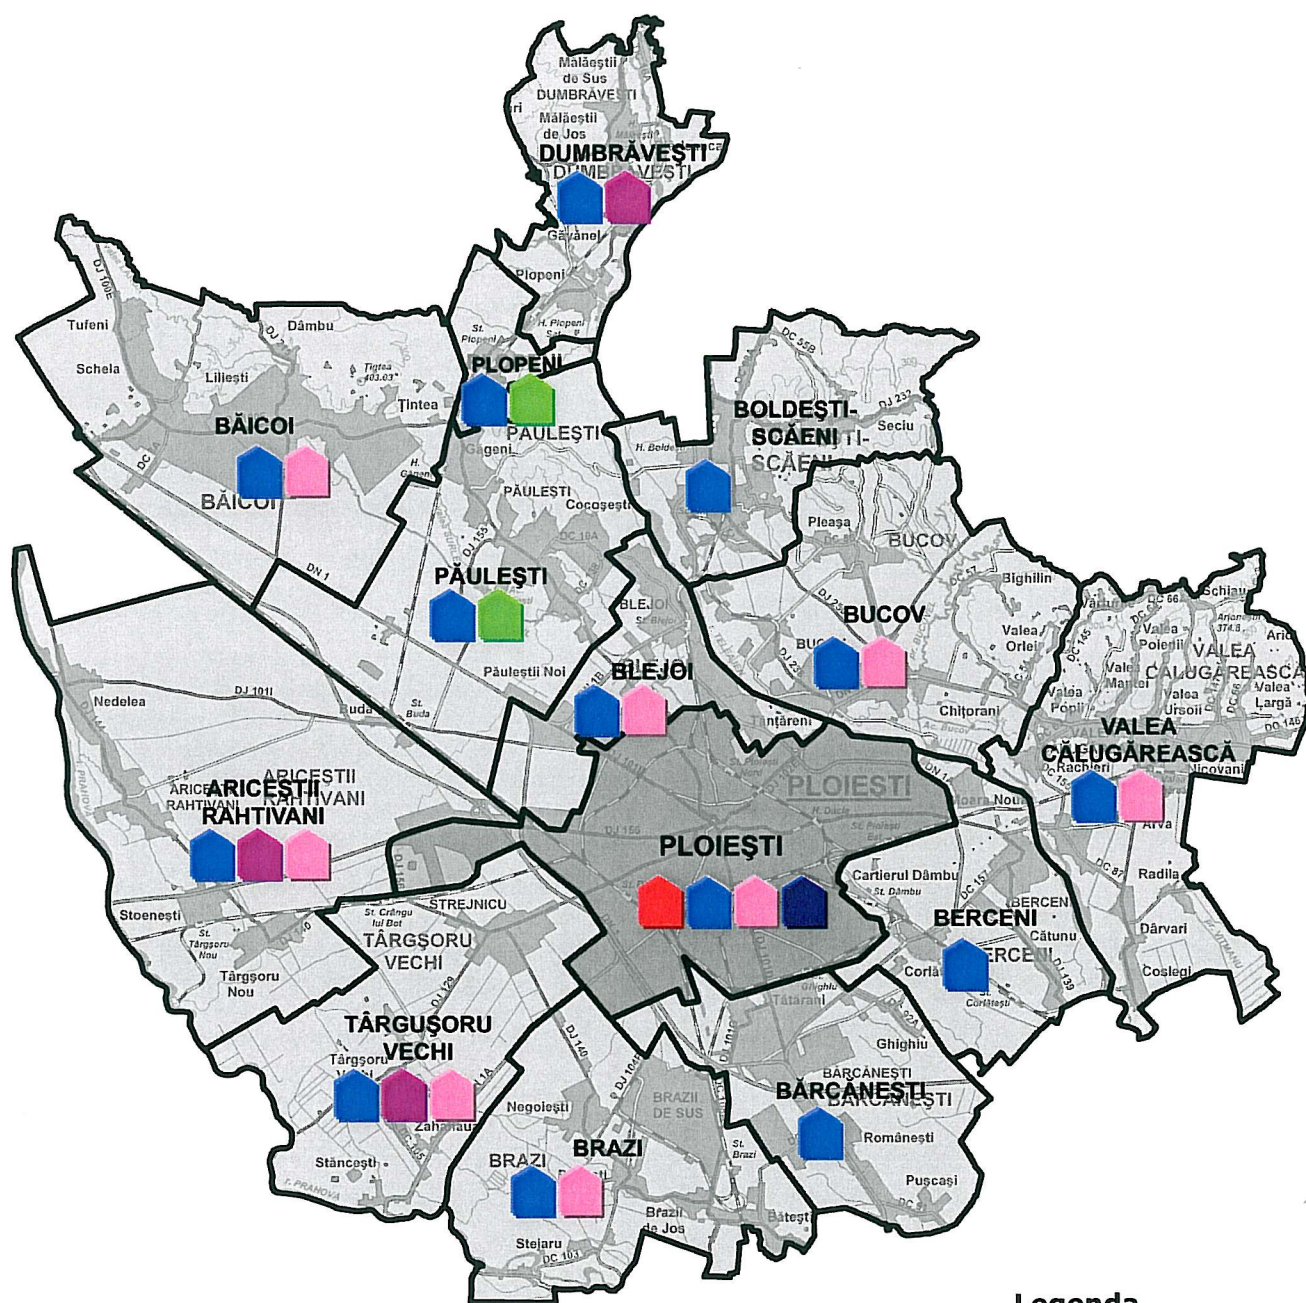

Legenda

SI-6A-1a	SI-6A-1b	SI-6A-2a	SI-6A-2b	SI-7A-1a și 1b	SI-7A-2a
----------	----------	----------	----------	----------------	----------

Secțiunea II: Infrastructura de mediu⁵

- **Program SII-1A-1:** Asigurarea capacității de alimentare cu apă la standarde europene

Proiecte:

SII-1A-1a: Instituirea prin împrejmuire a zonei de protecție severă pentru fronturile de captare de apă potabilă din partea de Nord și Nord-Est a municipiului Ploiești

Secțiunea II: Infrastructura de mediu

- **Program SII-1A-2:** Extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a apei potabile

Proiecte:

SII-1A-2a: Extinderea alimentării cu apă potabilă în zonele urbane și rurale prin realizarea unei conducte magistrale de apă potabilă pe traseul Ploiești-Mizil (din sursa Paltinu), pentru comunele adiacente acestui traseu (Valea Călugărească și Berceni din polul de creștere)

SII-1A-2b: idem prin realizarea magistralei de apă potabilă Brazi-Gorgota din sursa Paltinu pentru alimentarea localităților din sudul județului (Brazi, Bărcănești)

SII-1A-2c: Implementarea de tehnologii de depoluare a pânzei freatice, poluată cu produse petroliere în zona Ploiești (în coordonare cu proiect ECOLINKS)

SII-1A-2d: Asigurarea Directivei 98/83/CEE privind calitatea apei destinate consumului uman în Polul de Creștere

SII-1A-2e: Reabilitarea și extinderea rețelei de apă potabilă în municipiul Ploiești (cartier Mitică Apostol) și în zonele urbane ale Polului de Creștere

Secțiunea II: Infrastructura de mediu

- **Program SII-1A-3:** Dezvoltarea unui sistem de integrat de colectare și de epurare a apelor reziduale menajere și pluviale (conf. Directiva Consiliului Europei 91/271/CEE)

Proiecte:

SII-1A-3a: Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare din municipiul Ploiești (cartier Mitică Apostol, cartier Rudului, cartier Mimi, Cartier Râfov, cartier Bereasca)

SII-1A-3b: Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare din orașele din polul de creștere, Băicoi, Boldești Scăeni, Plopeni, (pentru zonele rurale vezi secțiunea V-Politici Complementare PNDR măsura 3.2.2 renovarea și dezvoltarea satelor, punct A)

⁵ Proiecte finanțate prin POS Mediu, POS competitivitate economică
IHS Romania SRL/30.09. 2009

Secțiunea II: Infrastructura de mediu

- **Program SII-1B-1:** Implementarea directivei UE privind utilizarea nămolurilor din stațiile de epurare

Proiecte:

SII-1B-1a: Identificarea terenurilor din cadrul polului de creștere și transferarea nămolurilor din stațiile de epurare pe aceste terenuri

Secțiunea II: Infrastructura de mediu

- **Program SII-2A-1:** Dezvoltarea infrastructurii de colectare selectivă a deșeurilor menajere (conf. Directiva Consiliului Europei 1999/31/CE și a Legii 426/2001)

Proiecte:

SII-2A-1a: Construcția stației de transfer de la Brazi

SII-2A-1b: Reabilitarea depozitului neconform urban Ploiești

SII-2A-1c: Construirea unei stații de compostare a deșeurilor vegetale în municipiul Ploiești

Secțiunea II: Infrastructura de mediu

- **Program SII-2A-2:** Realizarea sistemului de colectare a deșeurilor periculoase

Proiecte:

SII-2A-2a: Realizarea de puncte de transfer pentru deșeuri provenite din echipamente electrice, electronice, construcții și demolări de construcții provenite de la persoane fizice și juridice

Secțiunea II: Infrastructura de mediu

- **Program SII-2B-1:** Reabilitarea siturilor poluate ca urmare a intervențiilor antropice

Proiecte:

SII-2B-1a: Reabilitarea terenurilor poluate cu produse petroliere (Ploiești-centura de est-T14 A228, T12A170, Bărcănești, Berceni, Brazi-din prelucrare, Băicoi și Boldești Scăeni-din extracție)

SII-2B-1b: Reabilitarea zonei industriale cu halde de cenuși piritice și bataluri de fosfogips din comuna Valea Călugărească

SII-2B-1c: Reconvertire funcțională a rampei Teleajen

Secțiunea II: Infrastructura de mediu

- **Program SII-3A-1:** Identificarea și valorificarea resurselor pentru producerea de energie "verde"

Proiecte:

SII-3A-1a: Realizarea de sistemele de energie alternativă (parc solar, câmp eolian, lămpi solare, etc) la Ploiești, Băicoi, Dumbrăvești, Plopeni

SII-3A-1b: Inițierea și operaționalizarea parcului tehnologic pentru energie verde pentru identificarea și aplicarea metodelor de (1). depoluare a

terenurilor și de (2). producerea de energii alterantive (propunere teren în comuna Păulești, conf. Adresă nr. 82541/10.09.2009, sau propunere UPG Ploiești)

SII-3A-1c: Realizarea „Centrului pentru energii regenerabile” în cadrul parcului de agrement „Constantin Stere”, Bucov

Secțiunea II: Infrastructura de mediu

- **Program SII-4A-1:** Reabilitarea rețelelor de apă caldă și de termoficare

Proiecte:

SII-4A-1a: Înlocuirea rețelei termice de transport și de distribuție a agentului termic în zonele urbane ale Polului de Creștere

Secțiunea II: Infrastructura de mediu

- **Program SII-4A-2:** Introducerea de tehnologii avansate în funcționarea sistemului de termoficare

Proiecte:

SII-4A-2a: Achiziționarea și montarea unei instalații de ardere cu NOX redus la Termocentrala Brazi

SII-4A-2b: Implementarea la CET Brazi a unei unități complete de cogenerare pentru creșterea eficienței sistemului centralizat de producere a energiei termice

Secțiunea II: Infrastructura de mediu

- **Program SII-5A-1:** Regularizarea și ecologizarea cursurilor de apă

Proiecte:

SII-5A-1a: Reabilitarea și ecologizarea albiei pâraurilor Dâmbu, Bucova, Bleaja și Teleajen

Prezentarea spațială a proiectelor cuprinse în cadrul Secțiunii II


Program SII-1A-1, SII-1A-2, SII-1A-3, SII-1B-1

Program SII-2A-1, SII-2A-2, SII-2B-1

Program SII-3A-1

Program SII-4A-1, SII-4A-2

Program SII-5A-1

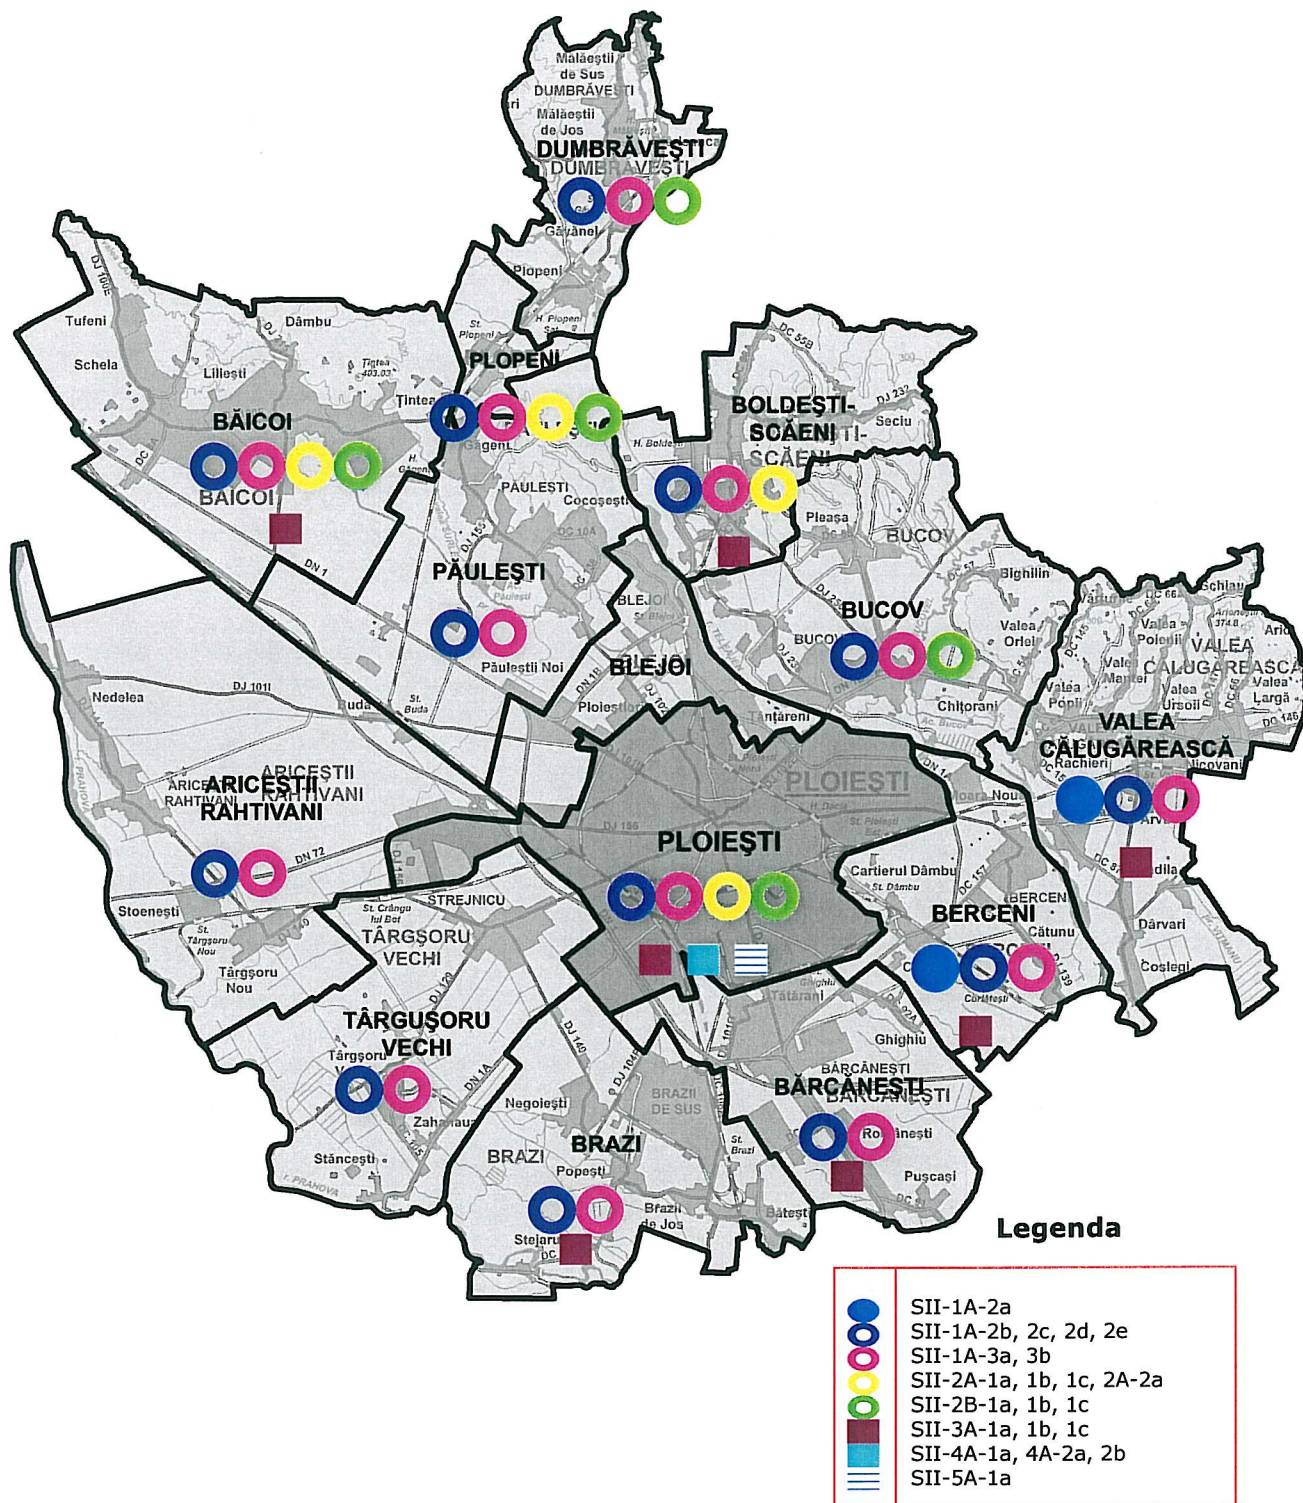

Secțiunea III: Infrastructura economică

- **Program SIII-1A-1:** Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri, inclusiv extinderea utilităților de bază necesare

Proiecte:

SIII-1A-1a: Reconversia funcțională a spațiilor din clădiri publice nefolosite (ex. Centrale Termice) și transformarea acestora în centru de afaceri în folosul dezvoltării sectorului IMM-uri la Băicoi

SIII-1A-1b: Realizarea Parcului Industrial Valea Călugărească, (coordonat cu proiectul Proiect SII-2B-1b: Reabilitarea zonei industriale cu halde de cenuși piritice și bataluri de fosfogips)

Secțiunea III: Infrastructura economică

- **Program SIII-2A-1:** Dezvoltarea de centre de excelență

Proiecte:

SIII-2A-1a: Creerea unui parc de cercetare prin colaboarea dintre UPG și sectorul privat (coordonat cu Proiect SII-3A-1b)

Secțiunea III: Infrastructura economică

- **Program SIII-3A-1:** Realizarea rețelilor broadband și a punctelor de acces public la internet

Proiecte:


SIII-3A-1a: Conectarea autorităților publice din polul de creștere în vederea operaționalizării în comun a datelor și informațiilor privind dezvoltarea Polului de Creștere Ploiești Prahova (etapa 1-Zona urbană a Polului de Creștere)

Prezentarea spațială a proiectelor cuprinse în cadrul Secțiunii III

Program SIII-1A-1

Program SIII-2A-1

Program SIII-3A-1

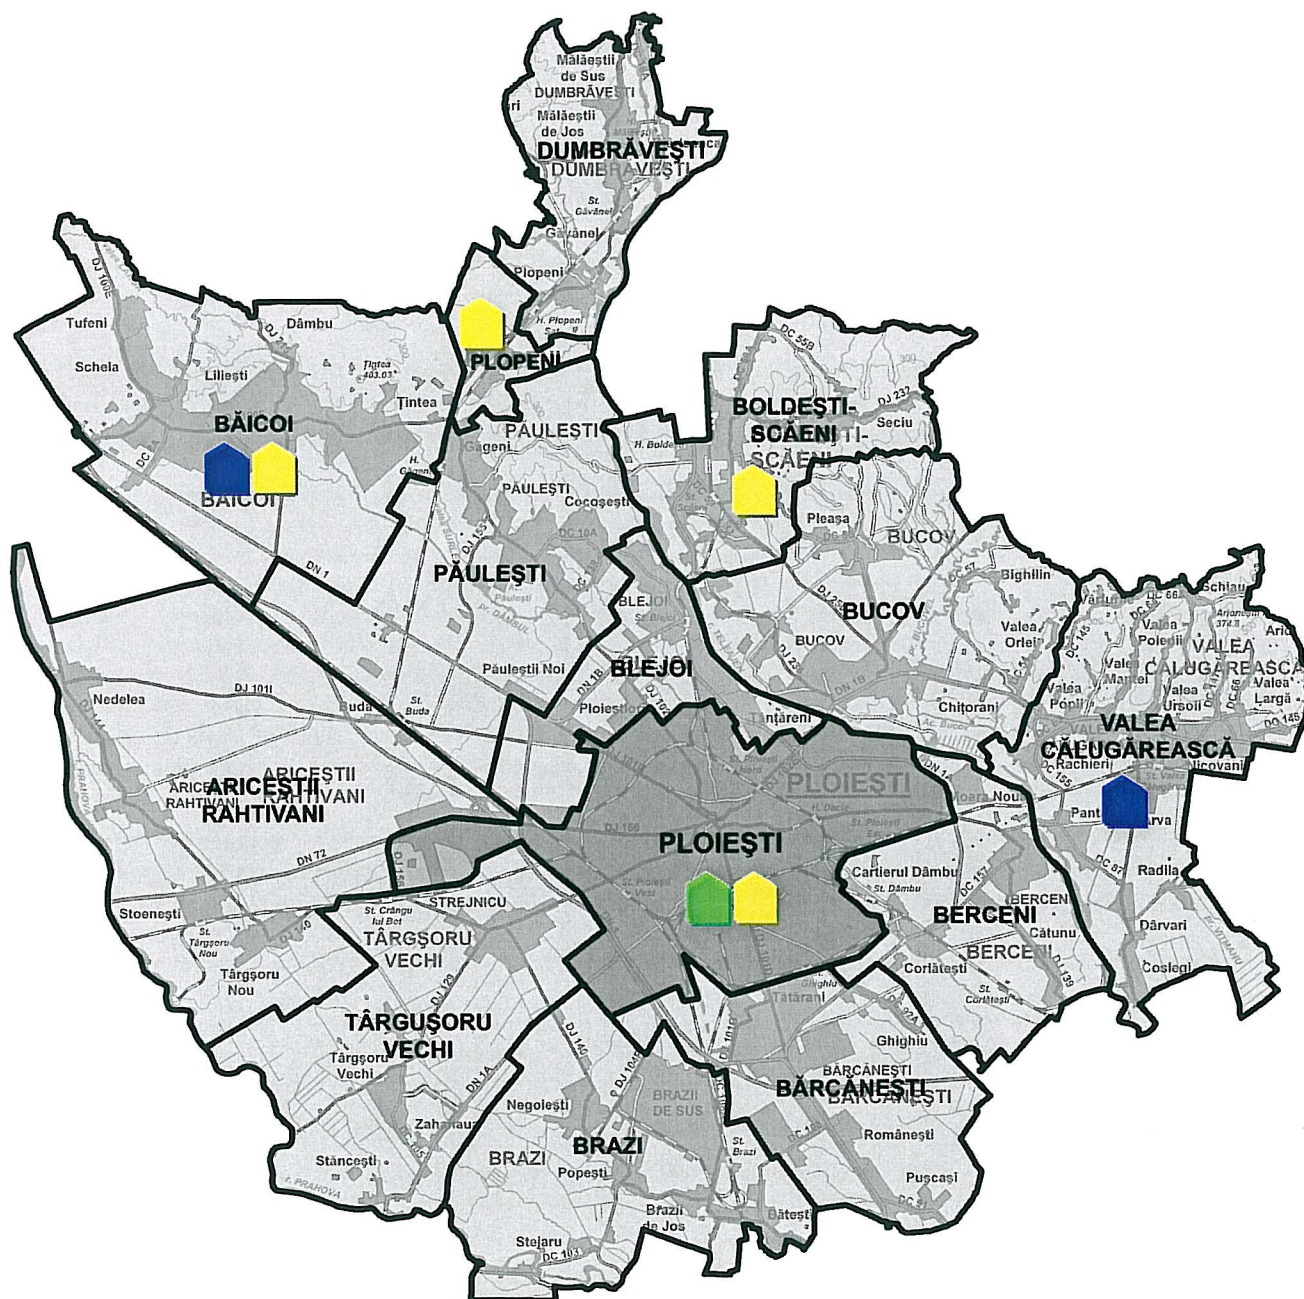

Legenda

	SIII-1A-1°, 1b
	SIII-2A-1a,
	SIII-3A-1a

Secțiunea IV: Dezvoltarea resurselor umane și a capacității administrative

- **Program SIV-1A-1:** Creșterea și diversificarea ofertei educaționale la nivelul polului de creștere

Proiecte:

SIV-1A-1a: Realizarea de programe de formare profesională pentru adulți, pe baza unei analize pe domenii de formare corelate cu caracteristicile pieței de muncă locale

Secțiunea IV: Dezvoltarea resurselor umane și a capacității administrative

- **Program SIV-1A-2:** Creșterea și diversificarea ofertei în servicii de orientare și consiliere profesională

Proiecte:

SIV-1A-2a: Realizarea de activități în orientarea și consilierea profesională în domenii de interes pentru dezvoltarea economică a polului de creștere (coordonat cu tema proiectului SI-6A-1b)

Secțiunea IV: Dezvoltarea resurselor umane și a capacității administrative

- **Program SIV-1B-1:** Dezvoltarea unui sistem de atragere de resurse umane cu potențial în dezvoltarea locală

Proiecte:

SIV-1B-1a: Realizarea de evenimente periodice de prezentare a ofertei de locuri de muncă

SIV-1B-1b: Instituirea unor burse pentru absolvenți de licee din țară în scopul continuării studiilor universitare în Ploiești

Secțiunea IV: Dezvoltarea resurselor umane și a capacității administrative

- **Program SIV-1C-1:** Dezvoltarea parteneriatului între sistemul universitar, instituții de cercetare și agenți economici

Proiecte:

SIV-1C-1a: Identificarea și realizarea unui „produs de cercetare” în domeniul măsurilor/metodelor de reciclare funcțională a terenurilor poluate

Secțiunea IV: Dezvoltarea resurselor umane și a capacității administrative

- **Program SIV-2A-1:** Recunoașterea meritelor întreprinderilor care promovează organizarea flexibilă a muncii și servicii pentru facilitarea reconcilierii vieții de familie cu activitatea profesională

Proiecte:

SIV-2A-1a: Instituirea unui premiu anual municipal pentru firme care implementează cu succes politici în favoarea angajaților

Secțiunea IV: Dezvoltarea resurselor umane și a capacității administrative

- **Program SIV-2B-1:** Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor pentru partenerii sociali și societatea civilă

Proiecte:

SIV-2B-1a: Sistemul Integrat pentru Managementul Interacțiunii cu Cetățenii (S.I.M.I.C.)

Secțiunea IV: Dezvoltarea resurselor umane și a capacității administrative

- **Program SIV-3A-1:** Dezvoltarea resurselor umane în domeniul managementului proiectelor propuse spre finanțare

Proiecte:

SIV-3A-1a: Dezvoltarea resurselor umane implicate în formularea strategiilor de dezvoltare locală și în domeniul operațional al implementării acestora prin proiecte

Secțiunea IV: Dezvoltarea resurselor umane și a capacității administrative

- **Program SIV-4A-1:** Realizarea sistemului de indicatori de performanță pentru servicii publice

Proiecte:

SIV-4A-1a: Realizarea, de către instituțiile furnizoare de servicii publice, a pachetului de indicatori de performanță pentru fiecare din serviciile oferite

Secțiunea V: Politici Complementare (PNDR)

(în coordonare cu secțiunea I, II, III)

- **Program SV-1A-1:** Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi în zona rurală coordonat cu Masura 3.1.2 - Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi

Proiecte:

SV-1A-1a: Dezvoltarea de servicii de producție legate de procesarea, ambalarea și distribuția produselor agricole

SV-1A-1b: Construirea unui târg regional pe traseul Vinului (Valea Călugărească)

SV-1A-1c: Dezvoltarea de mici servicii de deservire a populației rezidente pe baza unei analize de nevoi (ex. Întreținere-reparații proprietăți, frizerie, etc)

Secțiunea V: Politici Complementare (PNDR)

(în coordonare cu secțiunea I, II, III)

- **Program SV-1A-2:** Încurajarea activităților turistice în comune (coordonat cu Program SI-6A-2: Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural (trasee itinerante, situri arheologice) corespunzător PNDR Măsura 3.1.3 – Încurajarea activităților turistice

Proiecte:

SV-1A-2a: Realizarea de spații de cazare și de recreere pentru turismul de nișă (ex. Firme, circuit cultural regional)

Secțiunea V: Politici Complementare (PNDR)

(în coordonare cu secțiunea I, II, III)

- **Program SV-1A-3:** Crearea și modernizarea infrastructurii fizice de bază în comunele din polul de creștere (coordonat cu PNDR măsura 3.2.2 renovarea și dezvoltarea satelor punctul A)

Proiecte:

SV-1A-3a: Extinderea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în comunele din Polul de Creștere (Bărcănești, Berceni, Dumbrăvești, Târgșorul vechi, Valea Călugărească)

SV-1A-3b: Extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă în comunele din Polul de Creștere

SV-1A-3c: Extinderea și îmbunătățirea rețelei de apă uzată în comunele din Polul de Creștere (Berceni, Dumbrăvești)

Secțiunea V: Politici Complementare (PNDR)

(în coordonare cu secțiunea I, II, III)

- **Program SV-1A-4:** Îmbunătățirea serviciilor de bază în comunele din polul de creștere (coordonat cu PNDR măsura 3.2.2 renovarea și dezvoltarea satelor punctul B)

Proiecte:

SV-1A-4a: Îmbunătățirea infrastructurii sociale prin dotări aferente serviciilor sociale existente (Bărcănești, Berceni, Târgșorul Vechi)

SV-1A-4b: Îmbunătățirea infrastructurii de educație preuniversitară prin lucrări de consolidare, igienizare, echipare

SV-1A-4c: Extinderea școlilor cu spații educaționale adaptate nevoilor locale, atelier/laborator/clasa de muzică/sală de sport.

SV-1A-4d: Achiziționare utilaje pentru dezăpeziri, prăbușiri copaci, precum și de stingere a incendiilor

Secțiunea V: Politici Complementare (PNDR)

(în coordonare cu secțiunea I, II, III)

- **Program SV-1A-5:** Punerea în valoare a patrimoniului natural și construit rural (coordonat cu PNDR măsura 3.2.2 renovarea și dezvoltarea satelor, punct C)

Proiecte:

SV-1A-5a: Reabilitarea patrimoniului listat „grupa B” aflat în zona de influență a municipiului Ploiești

SV-1A-5b: Reabilitarea căminelor culturale pentru promovarea activităților cu caracter cultural în zona rurală a polului de creștere (în coordonare cu tema proiectului SI-6A-1b) (Bărcănești, Berceni, Dumbrăvești, Târgșorul Vechi, Valea Călugărească)

Secțiunea V: Politici Complementare (PNDR)

(în coordonare cu secțiunea I, II, III)

- **Program SV-1B-1:** Realizarea de centuri verzi pe terenuri non-agricole și neconstruibile în comune (în coordonare cu PNDR măsura 1.4.1/2.2.1 prima împădurire a terenurilor agricole)


Proiecte:

SV-1B-1a: Realizarea unei centurii verzii în partea de nord-est a polului de creștere prin împădurirea terenurilor de bonitate scăzută (comuna Dumbrăvești)

Prezentarea spațială a proiectelor cuprinse în cadrul Secțiunii V

Program SV-1A-1, 2, 3, 4, 5

Program SV-2B-1

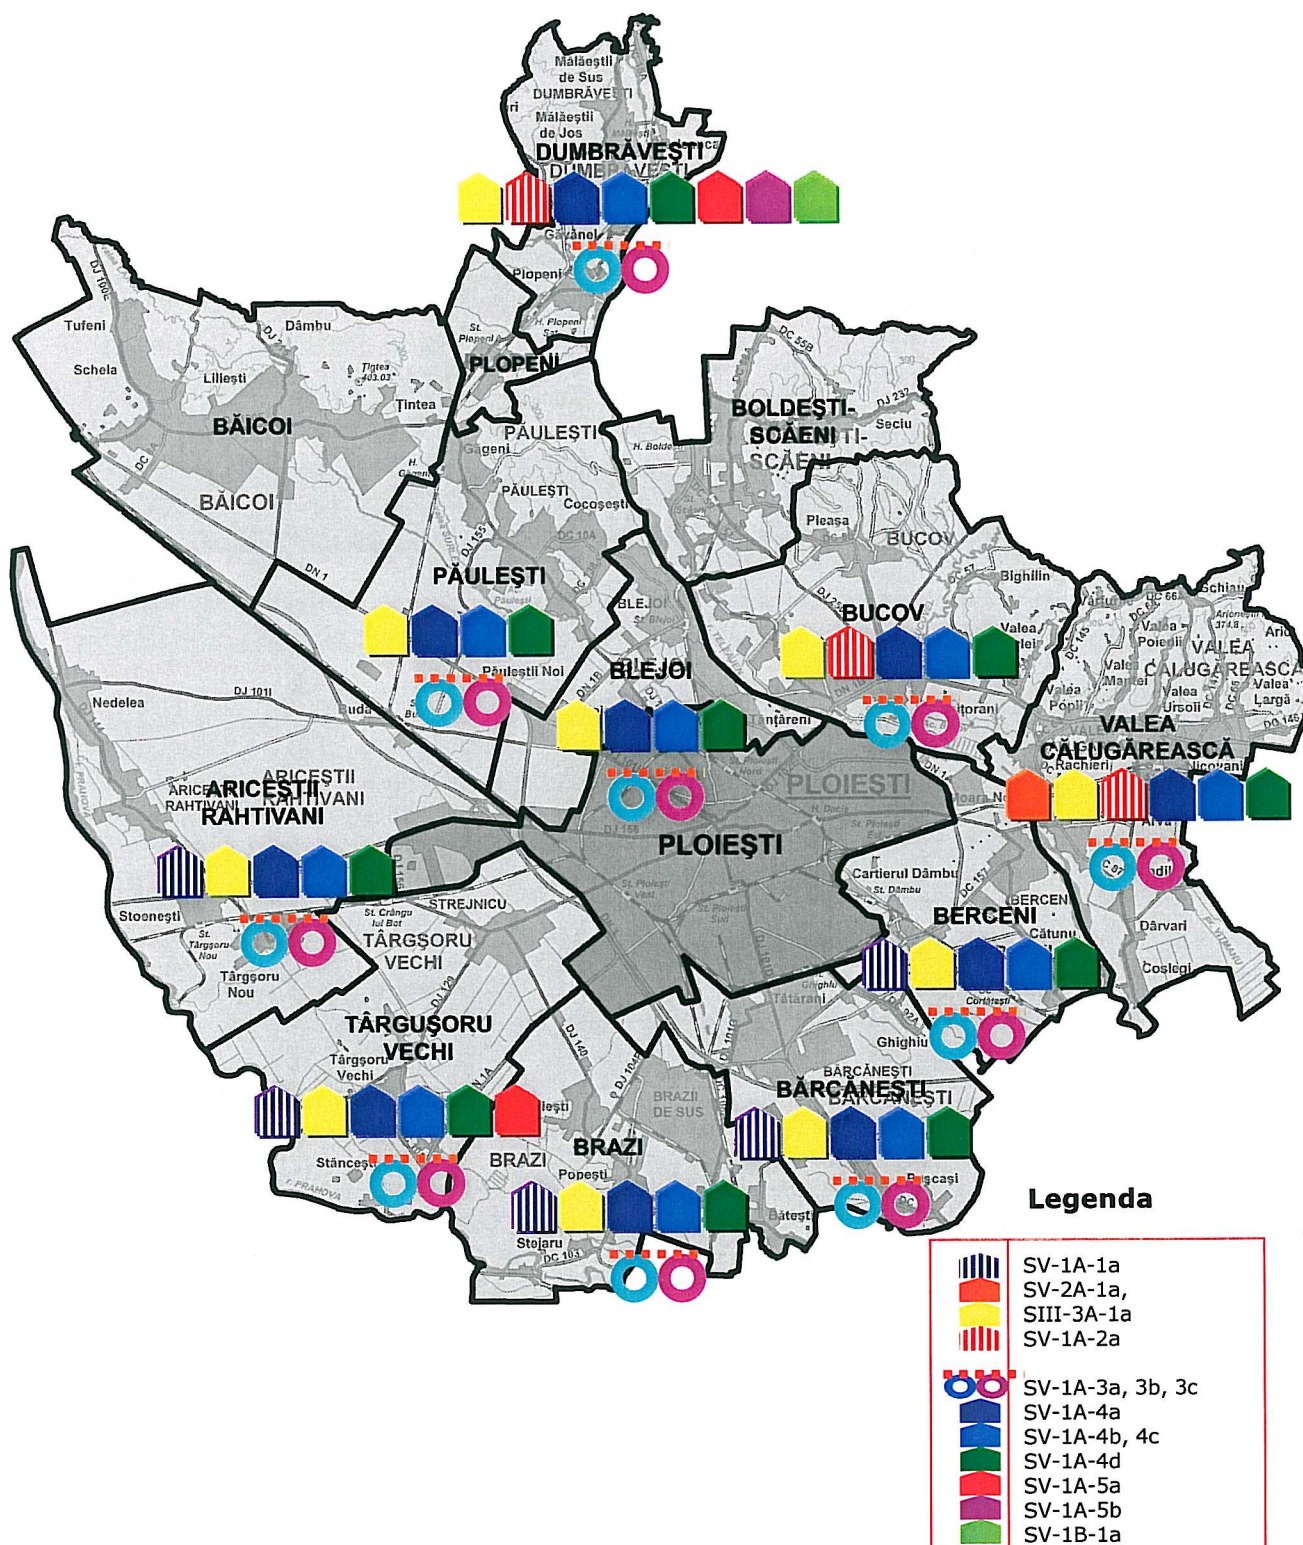

4.2.2. Lista proiectelor coordonate cu obiectivele de dezvoltare și cu sursele de finanțare

Obiectiv strategic	Obiective sectoriale	Sursa de co-finanțare	Lista proiectelor propuse spre finanțare pe axa 1
Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea infrastructurii urbane și a relațiilor funcționale dintre zonele urbane și rurale în cadrul Polul de Creștere "Ploiești-Prahova"	Obiectiv sectorial 1.1: Creșterea coeziunii teritoriale prin îmbunătățirea accesului Polului de Creștere la rețelele de transport și de telecomunicații naționale și europene	POR axa 1: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane <ul style="list-style-type: none">▪ infrastructura publică urbană Sursă complementară: POR Axă prioritară 2 (s.d. 2.1)	SI-1A-1a: Realizare pasaj rutier magistrala CF București-Brașov, strada Mărășești-Cartierul de Vest pentru creșterea gradului de accesibilitate a municipiului Ploiești dinspre coridorul european TEN-IV și dinspre cartierul Mitică Apostol
			SI-1A-1b: Legătura rutieră dintre pasaj magistrală CF București-Brașov și DN1, inclusiv lucrările de racordare la acesta (în coordonare cu tema Proiectului SI-1A-1a)
			SI-1A-1c: Realizare pasaj rutier peste CF Gara de Sud, municipiul Ploiești, pentru asigurarea conectării municipiului Ploiești cu zona cartier Mimiu (în coordonare cu tema proiectului SI-1A-2d)
			SI-1A-1d: Modernizarea și reabilitarea DJ 101D, km4-km6, și a pasajului peste CF în sat Tătărani, Comuna Bărcănești pentru îmbunătățirea accesibilității dinspre DN1 (proiect în realizare)
			SI-1A-1e: Realizare pasaj rutier peste CF, Bariera Unirii, Ploiești pentru creșterea accesibilității în partea de est a municipiului și către coridorul TEN-IX (în coordonare cu proiectul SI-1A-2e)
			SI-1A-1f: Pasaj rutier peste CF Ploiești-Mâneciu între DN1 și Drumul Vinului
			SI-1A-1g: Realizare pasaj rutier, peste DN1B în continuarea DJ 102 în comuna Blejoi, pentru creșterea accesibilității zonei de nord a polului de creștere și a locuitorilor acestuia către spitalul județean amplasat în municipiul Ploiești
			SI-1A-1h: Pasaj rutier peste DN1 în zona comunei Blejoi și a comunei Păulești, zona comercială de nord a municipiului Ploiești (în coordonare cu proiect SI-1A-2i)
			SI-1A-1a: Conectarea autorităților publice din polul de creștere în vederea operaționalizării în comun a datelor și informațiilor privind dezvoltarea Polului de Creștere Ploiești Prahova (et. 1-Zona urbană a Polului de Creștere)
TOTAL : 9 proiecte			

<p>Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea infrastructurii urbane și a relațiilor funcționale dintre zonele urbane și rurale în cadrul Polul de Creștere "Ploiești-Prahova"</p>	<p>Obiectiv sectorial 1.2: Promovarea sistemelor integrate de transport cu o repartitie modală echilibrată și cu o reducere a impactului asupra mediului</p>	<p>POR axa 1: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ transport și mobilitate <p>Sursă complementară: POR Axa prioritară 2 (s.d. 2.1)</p> <p>PNDR măsura 322, renovarea și dezvoltarea satelor, punct A</p>	<p>SI-1A-2a: Reabilitare traseu tramvai 102, municipiul Ploiești, prin lucrări vizând calea de rulare, stații adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizarea și automatizare</p> <p>SI-1A-2b: Idem pentru linia 101</p> <p>SI-1A-2c: Reabilitare șoseaua Vestului din municipiul Ploiești tronson II- str. Cosminelor/sos. Nordului, (în coordonare cu tema proiectului SI-1A-2a)</p> <p>SI-1A-2d: Prolungire legătură rutieră și de transport public între Gara de Vest și Gara de Sud, str. Libertății, inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al pietelor gărilor (în coordonare cu tema pr. SI-1A-1c)</p> <p>SI-1A-2e: Legătura rutieră dintre Gara de Sud și cartierul Bereasca, pentru creșterea mobilității în partea de est a municipiului și descongestionarea traficului în zona centrală a acestuia (în coordonare cu tema pr. SI-1A-1e)</p> <p>SI-1A-2f: Extinderea transportului public din municipiul Ploiești, cuprinzând mijloace de transport și stații pe tronsonul DJ 102 municipiul Ploiești-comuna Blejoi-comuna Păulești și spre sud către comuna Bărcănești pe DJ 101D-DN1</p> <p>SI-1A-2g: Terminal intermodal conectat la traseul tramvaiului 102 incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (zona Spital Județean)</p> <p>SI-1A-2h: Terminal intermodal conectat la traseul tramvaiului 101 cuprinzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete, prin reabilitarea Autogării Ploiești Sud</p> <p>SI-1A-2i: Realizarea legăturii rutiere între DN1 și DN1B, pentru descongestionarea traficului în zona de nord a municipiului Ploiești (în coordonare cu proiect SI-1A-1h)</p>
<p>Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea infrastructurii urbane și a relațiilor funcționale dintre zonele urbane și rurale în cadrul Polul de Creștere "Ploiești-Prahova"</p>	<p>Obiectiv sectorial 1.3: Creșterea calității locuirii prin îmbunătățirea aprovizionării cu apă, gestionarea apei și a deșeurilor, tratarea apelor uzate și modernizarea sistemelor de încălzire urbană</p>	<p>POS mediu axa prioritară 1 (s.d 1.1) axa prioritară 2 (sd 2.1) axa prioritară 3 (s.d 3.1)</p> <p>Sursa complementară: PNDR măsura 322, renovarea și dezvoltarea satelor, punct A</p>	<p>SII-1A-2a: Extinderea alimentării cu apă potabilă în zonele urbane și rurale prin realizarea unei conducte magistrale de apă potabilă pe traseul Ploiești-Mizil (din sursa Paltinu), pentru comunele adiacente acestui traseu</p> <p>SII-1A-2b: Idem prin realizarea magistralei de apă potabilă Brazi-Gorgota din sursa Paltinu pentru alimentarea localităților din sudul județului (Brazi, Bărcănești)</p> <p>SII-1A-2c: Implementarea de tehnologii de depoluare a pânzei freactice, poluată cu produse petroliere în zona Ploiești (în coordonare cu proiect ECOLINKS)</p>

TOTAL : 9 proiecte

SII-1A-2d: Asigurarea Directivei 98/83/CEE privind calitatea apei destinate consumului uman

SII-1A-2e: Reabilitarea și extinderea rețelei de apă potabilă în municipiul Ploiești (cartier Mitică Apostol) și în zonele urbane ale Polului de Creștere

SV-1A-3b: Extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă în comunele din Polul de Creștere

SII-1A-3a: Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare din municipiul Ploiești (cartierele Mitică Apostol, Rudului, Mimi, Răfov, Bereasca)

SII-1A-3b: Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare din orașele din polul de creștere, Băicoi, Boldești Scăeni, Plopeni

SII-4A-1a: Înlocuirea rețelei termice de transport și de distribuție a agentului termic în zonele urbane ale Polului de Creștere

SII-4A-2a: Achiziționarea și montarea unei instalații de ardere cu NOx redus la Termocentrala Brazi

SII-4A-2b: Implementarea la CET Brazi a unei unități complete de cogenerare pentru creșterea eficienței sistemului centralizat de producere a energiei termice

SV-1A-3c: Extinderea și îmbunătățirea rețelei de apă uzată în comunele din Polul de Creștere

SII-1B-1a: Identificarea terenurilor din cadrul polului de creștere și transferarea nămolurilor rezultate din stațiile de epurare pe aceste terenuri

SII-2A-1a: Construcția stației de transfer de la Brazi Ploiești

SII-2A-1b: Reabilitarea depozitului neconform urban Ploiești

SII-2A-1c: Construirea unei stații de compostare a deșeurilor vegetale în municipiul Ploiești

SII-2A-2a: Realizarea de puncte de transfer pentru deșeurii provenite din echipamente electrice, electronice, construcții și demolări de construcții

TOTAL : 17 proiecte

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea infrastructurii urbane și a relațiilor funcționale dintre zonele urbane și rurale în cadrul Polului de Creștere "Ploiești-Prahova"

Obiectiv sectorial 1.4: Îmbunătățirea funcționalității mediului fizic urban și rural și a reducerii factorilor de risc natural și antropoc, prin reabilitarea terenurilor degradate, contaminare sau necultivate și de atenuare a schimbărilor climatice

POR axa 1: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban: infrastructura publică urbană

Surse complementare:
POR axa prioritară 2 (s.d 2.1), axa prioritară 3(s.d. 3.3) axa prioritară 4 (s.d. 4.2)

POS Mediu axa prioritară 2 (s.d. 2.1.) PNDR axa 2, măsura 221 îmbunătățirea mediului și a spațiului rural, axa 3 măsura 322 renovarea și dezvoltarea satelor punct A și B	petroliere (Ploiești-centura de est-T14 A228, T12A170, Bărcănești, Berceni, Brazi-din prelucrare, Băicoi și Boldești Scăeni-din extracție) SII-2B-1c: Reconvertire funcțională a rampei Teleajen SII-5A-1a: Reabilitarea și ecologizarea albiei pâraurilor Dâmbu, Bucova, Bleaja și Teleajen SI-4A-1a: Dezvoltarea sistemului actual de urmărire a situațiilor de urgență SV-1A-4d: Achiziționare utilaje pentru dezăpeziri, prăbușiri copaci precum și de stingere a incendiilor SV-1B-1a: Realizarea unei centuri verzi în partea de nord-est a polului de creștere prin împădurirea terenurilor de bonitate scăzută (comuna Dumbrăvești)		
	SI-1B-2a: Realizarea parcului municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice SI-1B-2b: Reabilitarea, dezvoltarea și valorificarea parcului „Constantin Stere”, inclusiv căi acces și utilități publice SI-1B-2c: Reabilitare spții verzi, alei și mobilier urban, inclusiv iluminat public în cadrul parcului “Cleopatra Trubețkoj” din Băicoi SI-6A-1a: Modernizare imobil <i>Halele Centrale Ploiești</i> SI-6A-1b: Crearea unei rețele culturale bazată pe tehnologia extragerii și prelucrării petrolului, constituită la nivel de Pol de Creștere și prin reabilitarea căminelor culturale din zona rurală SI-6A-2a: Realizarea lucrărilor de conservare și de punere în valoare a siturilor arheologice existente în polul de creștere Ploiești Prahova (Dumbrăvești, Târgșoru Vechi, Ariceștii Rahtivani-Buda) SI-6A-2b: Punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu existente pe traseele itinerante “drumul voievozilor”, “drumul conacelor familiei cantacuzine”, “circuitul Bucovelului” “drumul roman al vinului” SV-1A-5a: Reabilitarea patrimoniului listat „grupa B” aflat în zona de influență a municipiului Ploiești SV-1A-5b: Reabilitarea căminelor culturale pentru promovarea activităților cu caracter cultural în zona rurală a polului de creștere SI-7A-1a: Protejarea și conservarea rezervației naturale forestieră “Broasca” SI-7A-1b: Protejarea și conservarea rezervației forestiere “Pădurea Plopeni”		
TOTAL : 9 proiecte			
Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea infrastructurii urbane și a relațiilor funcționale dintre zonele urbane și rurale în cadrul Polul de Creștere “Ploiești-Prahova”	Obiectiv sectorial 1.5: Consolidarea atractivității Polului de Creștere prin protejarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural susținute de servicii turistice cu o valoare adăugată considerabilă	POR axa 1: Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban: <ul style="list-style-type: none">Infrastructura publică urbanăRestaurarea, consolidarea, protejarea și conservarea clădirilor de patrimoniu Surse complementare: POR axa prioritară 5 (s.d 5.1) POS Mediu axa prioritară 4 (s.d 4.1) PNDR măsura 322, renovarea și dezvoltarea satelor, punct B Fond național de mediu	
TOTAL : 55 proiecte			
TOTAL: 11 proiecte			

<p>Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea capitalului uman prin asigurarea accesului egal al tuturor cetățenilor din polul de creștere la servicii publice de calitate</p>	<p>Obiectiv sectorial 2.1: Creșterea calității infrastructurii sociale prin investiții în favoarea grupurilor dezavantajate și de susținere reintegrării în societate</p>	<p>POR axa 1: Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuințelor sociale și îmbunătățirea serviciilor sociale</p> <p>Surse complementare: POR axa prioritară 3 (s.d. 3.2) Reabilitarea modernizării/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale PNDR măsura 322, renovarea și dezvoltarea satelor, punct B</p>	<p>SI-2A-1a: Realizarea condițiilor de acces al persoanelor cu dizabilități în toate clădirile publice din Polul de Creștere Ploiești-Prahova SI-3A-1a: Reabilitarea/dezvoltarea unei spălătorii sociale pentru persoane cu dizabilități, bătrâni fără familie și familii cu mulți copii în municipiul Ploiești SI-3A-1b: Reabilitarea/extinderea centrelor de asistență din Ploiești, Plopeni, Băicoi, Boldești-Scăeni, Aricești Rahtivani SI-3A-1c: Extinderea și modernizarea fermei de copii Concordia din comuna Aricești-Rahtivani SI-3A-1d: Extinderea și modernizarea centrului de asistență pentru persoane adulte cu handicap în orașul Băicoi/Liliești SI-3A-1e: Realizarea unui cămin de bătrâni prin schimbarea destinației cazarmei din str. Cosminelor nr. 11A, Ploiești SI-3A-2a: Realizarea unei rețele de servicii la domiciliu, pentru persoane în vârstă sau cu handicap SI-3A-3a: Realizarea de programe de perfecționare specializată pentru asistenții sociali și maternali SV-1A-4a: Îmbunătățirea infrastructurii sociale prin dotări aferente serviciilor sociale existente</p> <p>SI-5A-1a: Realizarea și echiparea de laboratoare necesare susținerii cercetării, în parteneriat cu sectorul privat, în domeniul energiei alternative SI-5A-2a: Reabilitare Colegiul "Virgil Madgearu", Ploiești SI-5A-2b: Modernizarea și echiparea spațiilor specializate în școli și licee SI-5A-3a: Punerea în siguranță din punct de vedere seismic, igienizarea, echiparea și mobilarea grădinițelor din Polul de Creștere Ploiești-Prahova (zonele urbane) SV-1A-4b: Îmbunătățirea infrastructurii de educație preuniversitară prin lucrări de consolidare, igienizare, echipare SV-1A-4c: Extinderea școlilor cu spații educaționale adaptate nevoilor locale, atelier/laborator/clasa de muzică/sală de sport SI-1A-1a: Realizarea de programe de formare profesională pentru adulți, pe baza unei analize pe domenii de formare corelate cu caracteristicile pieței de muncă locale SI-1A-2a: Realizarea de activități în orientarea și consilierea profesională în domenii de interes pentru</p>
<p>Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea capitalului uman prin asigurarea accesului egal al tuturor cetățenilor din polul de creștere la servicii publice de calitate</p>	<p>Obiectiv sectorial 2.2: Dezvoltarea capitalului uman prin creșterea calității infrastructurii educaționale și de formare profesională</p>	<p>POR axa prioritară 3 (s.d.3.4) Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă</p> <p>PNDR măsura 322 renovarea și dezvoltarea satelor</p>	<p>TOTAL: 9 proiecte</p>

dezvoltarea economică a polului de creștere (coordonat cu tema proiectului SI-6A-1b)

SIV-1B-1a: Realizarea de evenimente periodice de prezentare a ofertei de locuri de muncă

SIV-1B-1b: Instituirea unor burse pentru absolvenți de licee din țară în scopul continuării studiilor universitare în Ploiești

SV-1A-4b: Îmbunătățirea infrastructurii de educație preuniversitară prin lucrări de consolidare, igienizare, echipare

SV-1A-4c: Extinderea școlilor cu spații educaționale adaptate nevoilor locale, atelier/laborator/clasa de muzică/sală de sport

SI-2A-2a: Modernizarea și reabilitarea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Ploiești, clădire și instalații
SI-2A-2b: Modernizarea și reabilitarea spitalelor/ambulatoriilor din zonele urbane ale Polului de Creștere Ploiești-Prahova

SII-3A-1a: Realizarea de sistemele de energie alternativă (parc solar, câmp eolian, lămpi solare, etc) la Ploiești, Băicoi, Dumbrăvești, Plopeni

SII-3A-1b: Înființarea și operaționalizarea parcului tehnologic pentru energie verde pentru identificarea și aplicarea metodelor de (1). depoluare a terenurilor și de (2). producerea de energii alternative

SII-3A-1c: Realizarea „Centrului pentru energii regenerabile” în cadrul parcului de agrement „Constantin Stere”, Bucov

SIII-1A-1a: Reconvertirea funcțională a spațiilor din clădiri publice nefolosite în folosul dezvoltării sectorului IMM-uri la Băicoi

SIII-1A-1b: Realizarea Parcului Industrial Valea Călugărească în coordonare cu Proiect SII-2B-1b: Reabilitarea zonei industriale cu halde de cenuși pirifice și bataluri de fosfogips din comuna Valea Călugărească

SV-1A-1a: Dezvoltarea de servicii de producție legate de procesarea, ambalarea și distribuția produselor agricole

SV-1A-1b: Construirea unui târg regional pe traseul Vinului (Valea Călugărească)

SV-1A-1c: Dezvoltarea de mici servicii de deservire a populației rezidente

TOTAL: 12 proiecte

Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea capitalului uman prin asigurarea accesului egal al tuturor cetățenilor din polul de creștere la servicii publice de calitate	Obiectiv sectorial 2.3: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate prin asigurarea unui act medical profesionist într-un spațiu echipat și igienic	POR axa prioritară 3 (s.d. 3.1) Reabilitarea modernizării/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate
--	--	---

TOTAL: 2 proiecte

TOTAL: 23 proiecte

Obiectiv strategic 3: Susținerea dezvoltării economice durabile integrate la nivelul Polului de Creștere și a ocupării forței de muncă	Obiectiv sectorial 3.1: Dezvoltarea infrastructurii economice locale, cu prioritate a tehnologiilor avansate nepoluante, prin investiții productive ce contribuie la crearea și salvagardarea locurilor de muncă durabile	POR axa 1: Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri Surse complementare: POR axa prioritară 4 (s.d. 4.1, 4.2) POS Creșterea Competitivității Economice axele prioritară 4, (s.d. 4.2) PNDR axa măsura 312, măsura 313, măsura 322
--	--	--

SV-1A-2a: Realizarea de spații de cazare și de recreere pentru turismul de nișă			
TOTAL: 9 proiecte			
Obiectiv strategic 3: Sustinerea dezvoltării economice durabile integrate la nivelul Polului de Creștere și a ocupării forței de muncă	Obiectiv sectorial 3.2: Consolidarea și diversificarea capacităților de cercetare și de dezvoltare tehnologică urmărind și creșterea transferului de tehnologii între sectorul academic și agenții economici (conf. Regulament (CE) nr. 1080/2006, articol 4, punct 1 și 2)		SIII-2A-1a: Crearea unui parc de cercetare prin colaborarea dintre UPG Ploiești și sectorul privat (coordonat cu Proiect SII-3A-1b) SIV-1C-1a: Identificarea și realizarea unui „produs de cercetare” în domeniul măsurilor/metodelor de reciclare funcțională a terenurilor poluate SIV-2A-1a: Instituirea unui premiu anual pentru firme care implementează cu succes politici în favoarea angajaților
TOTAL: 3 proiecte			
TOTAL: 12 proiecte			
Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea durabilă a comunităților locale și a formelor de management la nivelul Asociației de Dezvoltare Ploiești-Prahova	Obiectiv sectorial 4.1: Creșterea capacității operaționale a administrației publice locale în procesul de realizare și de implementare a proiectelor comune de dezvoltare	PODCA axele prioritare 1 și 2 PNDR axa prioritară 4	SIV-3A-1a: Dezvoltarea resurselor umane implicate în formularea strategiilor de dezvoltare locală și în domeniul operațional al implementării acestora prin proiecte
Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea durabilă a comunităților locale și a formelor de management la nivelul Asociației de Dezvoltare Ploiești-Prahova	Obiectiv sectorial 4.2: Dezvoltarea formelor de management pentru serviciile publice realizate pentru locuitorii și vizitatorii polului de creștere	PODCA axele prioritare 1 și 2	SIV-4A-1a: Realizarea de către instituțiile furnizoare de servicii publice, a pachetului de indicatori de performanță pentru fiecare din serviciile oferite
TOTAL: 1 proiect			
TOTAL: 2 Proiecte			
TOTAL: 92 Proiecte			

4.2.3. Lista proiectelor selectate spre co-finanțare prin POR - axa prioritară 1

În urma analizei financiare a pachetului de proiecte menționat la punctul 4.2.2, în urma dezbaterilor între partenerii Polului de Creștere privind proiectele înaintate către ADR MS sunt lisate următoarele proiecte, organizate conform Anexei 1, Model_A_Conținut recomandat al PIDU. Criteriile de constituire a listei proiectelor care solicită co-finanțare sunt următoarele:

1. Proiectul răspunde unei probleme clar identificate și a cărei rezolvare conduce la îmbunătățirea situației existente și la obținerea unui avantaj competitiv pentru Polul de creștere și a zonei sale de influență;
2. Rezultatele proiectelor conduc la atingerea obiectivelor generale și a obiectivelor sectoriale ale PIDU Ploiești-Prahova;
3. Proiectul se află într-o fază avansată din punct de vedere al studiilor tehnico-economice și al aspectelor juridice privind terenul (proprietate, exproprieri);
4. Proiectul a fost acceptat de partenerii Polului de Creștere Ploiești-Prahova;
5. Prin analiza cost beneficiu, proiectul are indicatori de performanță financiari și economici;
6. Lucrările proiectului sunt gata până la data de 31.07.2015.

Proiectele propuse acoperă tematic și financiar problematica Polului de Creștere, într-un număr de 16 și cu o valoare aproximativă de 125,5 milioane de euro, după cum urmează:

Nr. Crt.	Proiecte	Reabilitarea infrastructurii urbane			Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri	Reabilitarea infrastructurii sociale
		a). Infra urbană	b). transport	c). patrimoniu		
1	Număr proiecte	10	2	0	3	1
2	Valoare proiecte	97,5 mil euro			22 mil euro	6 mil. euro

4.3. Graficul de implementare a proiectelor

Activitățile necesare pregătirii proiectelor individuale și a activităților necesare implementării acestora se desfășoară pe perioada 2009-2015. Graficul pe trimestre este prezentat în anexa 4.3.

Anexa A – Lista proiectelor individuale finanțabile prin Axa Prioritară 1

Cod proiect	Denumire proiect	Solicitant	Obiectiv și activități propuse	Perioada de implementare		Buget proiect			
				Anul începerii ⁶	Anul finalizării ⁷	Valoare nerambursabilă solicitată (mii euro)	Contribuție proprie costuri eligibile (mii)	Costuri neeligibile (mii)	Total (mii)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)+(8)+(9)
SI-1A-1a	Realizare pasaj rutier magistrală CF București-Brașov, strada Mărășești-Carterul de Vest pentru creșterea gradului de accesibilitate a municipiului Ploiești dinspre coridorul european TEN-IV și dinspre cartierul Mitică Apostol	CL Ploiești	Vor fi detaliate în fișa proiectului	2011	2013	16 693,416	Echivalentul în euro a procentului de 2%	Valoare TVA	
SI-1A-1b	Legătura rutieră dintre pasaj magistrală CF București-Brașov și DN1, inclusiv lucrările de racordare la acesta (în coordonare cu tema Proiectului SI-1A-1a)	CL Ploiești		2013	2014	4 000,000	Echivalentul în euro a procentului de 2%	Valoare TVA	
SI-1A-1g	Realizare pasaj rutier, peste DN1B în continuarea DJ 102 în comuna Blejoi, pentru creșterea accesibilității zonei de nord a polului de creștere și a locuitorilor acesteia către spitalul județean amplasat în municipiul Ploiești	CJ Prahova		2012	2014	10 000, 000	Echivalentul în euro a procentului de 2%	Valoare TVA	
SI-1A-1h	Pasaj rutier peste DN1 în zona comunei Blejoi și a comunei Păulești, zona comercială de nord a municipiului Ploiești	CJ Prahova		2010	2011	9 316, 219	Echivalentul în euro a procentului de 2%	Valoare TVA	
SI-1A-2i	Realizarea legăturii rutiere între DN1 și DN1B, pentru descongestionarea traficului în zona de nord a municipiului Ploiești						Echivalentul în euro a procentului de 2%	Valoare TVA	

⁶ / Propuneri pentru această etapă a studiului. Trebuie să fie confirmate de beneficiari în baza SF-urilor realizate.

⁷ / idem 8

SI-1A-2d	Prelungire legătură rutieră și de transport public între Gara de Vest și Gara de Sud, str. Libertății, inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor (în coordonare cu tema pr. SI-1A-1c)	CL Ploiești		2011	2013	6 090,400	Echivalentul în euro a procentului de 2%	Valoare TVA	
SI-1A-2a	Reabilitare rutieră și traseu tramvai linia 102	CL Ploiești		2011	2013	17 500,000	Echivalentul în euro a procentului de 2%	Valoare TVA	
SI-1A-2b	Reabilitare rutieră și traseu tramvai linia 101	CL Ploiești		2011	2013	17 500,000	Echivalentul în euro a procentului de 2%	Valoare TVA	
SI-1A-2c	Reabilitare șoseaua Vestului din municipiul Ploiești tronson II-str. Cosminelor/sos. Nordului, (în coordonare cu tema proiectului SI-1A-2a)	CL Ploiești		2011	2012	2 577, 714	Echivalentul în euro a procentului de 2%	Valoare TVA	
SI-1A-2d:	Terminal intermodal conectat la traseul tramvaiului 102 (zonă spital Județean	CL Ploiești		2011	2013	10 000,000	Echivalentul în euro a procentului de 2%	Valoare TVA	
SI-1B-2a	Realizarea parcului municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice	CL Ploiești		2012	2014	5 000,000	Echivalentul în euro a procentului de 2%	Valoare TVA	
SII-3A-1a	Realizarea de sistemele de energie alternativă (parc solar, câmp eolian, lămpi solare, etc) la Ploiești, Băicoi, Dumbrăvești, Plopeni	CJ Prahova		2011	2012	2 000,000	Echivalentul în euro a contribuției beneficiarului (50%)	Valoare TVA	
SII-3A-1b	Inființarea și operaționalizarea parcului tehnologic pentru energie verde pentru identificarea și aplicarea metodelor de (1). depoluare a terenurilor și de (2). producerea de energii alterantive	CL Ploiești CJ Prahova		2011	2014	15 000,000	Echivalentul în euro a contribuției beneficiarului (50%)	Valoare TVA	
SII-2B-1b	Realizarea Parcului Industrial Valea Călugărească în coordonare cu Proiect SII-2B-1b: Reabilitarea zonei	CJ Prahova		2011	2013	5 000,000	Echivalentul în euro a contribuției beneficiarului	Valoare TVA	

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creștere Ploiești-Prahova
Partea a IV-a : Planul de Acțiune

	industriale cu halde de cenuși piritice și bataluri de fosfogips din comuna Valea Călugărească ⁸						(50%)		
SI-3A-1a	Conectarea autorităților publice din polul de creștere în vederea operationalizării în comun a datelor și informațiilor privind dezvoltarea Polului de Creștere Ploiești Prahova (et. 1-Zona urbană a Polului de Creștere	CL Ploiești CJ prahova		2011	2014	5 000,000	Echivalentul în euro a procentului de 2%	Valoare TVA	
SI-3A-1b	Reabilitarea/extinderea centrelor de asistență din Ploiești, Plopeni, Băicoi, Boldești-Scăeni, Aricești Rahtivani	CL Ploiești CJ Prahova		2011	2013	6 000,000	Echivalentul în euro a procentului de 2%	Valoare TVA	
Sub-total 1(buget proiecte)						~125 500,000			
Costuri implementare PIDU						~ 1 000,000			
Total						~ 126 500,000			

⁸ / Acest proiect se poate depune și pe POR axa prioritară 4, s.d. 4.2.
IHS Romania SRL/30.09. 2009

Anexa 4.3: Graficul implementării proiectelor individuale

NR. CRT.	PROIECT	09	2010				2011				2012				2013				2014				2015	
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T1	T2		
1	SI-1A-1a																							
2	SI-1A-1b																							
3	SI-1A-1g																							
4	SI-1A-1h																							
5	SI-1A-2i																							
6	SI-1A-2d																							
7	SI-1A-2a																							
8	SI-1A-2b																							
9	SI-1A-2c																							
10	SI-1A-2d																							
11	SI-1B-2a																							
12	SII-3A-1a																							
13	SII-3A-1b																							
14	SII-2B-1b																							
15	SIII-3A-1a																							
16	SI-3A-1b																							

Legenda:



Etapa de pregătire a SF, PE, DE, exproprieri, dosare de licitație pt. execuție



Perioada de realizarea a proiectelor

4.4. Fișa proiectelor propuse spre co-finanțare

(Conform modelului din **Anexa 4.4**)

Sinteza proiectelor din *Anexa A*, prezentate conform Fișelor de proiect:

Lista fișelor:

(se finalizează odată cu stabilirea listei definitive a proiectelor)

Anexa 4.4. Fișă de proiect – model⁹:

Titlul proiectului:			
Localizarea proiectului:			
Solicitant:			
Sursa de finanțare:			
PLANUL/POZA ZONEI DE REFERINTA	DESCRIEREA PROIECTULUI		
	Context:		
	Contribuție la atingerea obiectivelor strategice ale PIDU:		
	Obiective:		
	Grupuri țintă:		
	Domeniul vizat de proiect:		
	Indicatori:		
	Plan de activități și cost estimativ:		
	Activitate	Cost estimativ	Perioada de implementare
	1.		
	2.		
...n			
Cost total			
Stadiul proiectului:			
Alte comentarii:			

⁹ sursa: recomandare AMPOR din 05.02.2009
IHS Romania SRL/30.09. 2009
